

【市民病院整備事業の進捗状況と今後のスケジュール】（報告）

H28.5.6 新館外来診療開始。

H29.6.30 本館（旧北棟）改修完了。


同年 7.14 付属棟（旧仮設管理棟）耐震補強工事完了予定。

7.18 本館及び付属棟の改修部分使用開始予定。

H30.1 南館解体工事完了予定。

H30 年度 敷地内のバスやタクシー等のロータリーなどの外構及び植栽工事。

H31.3.末 グランドオープン予定。

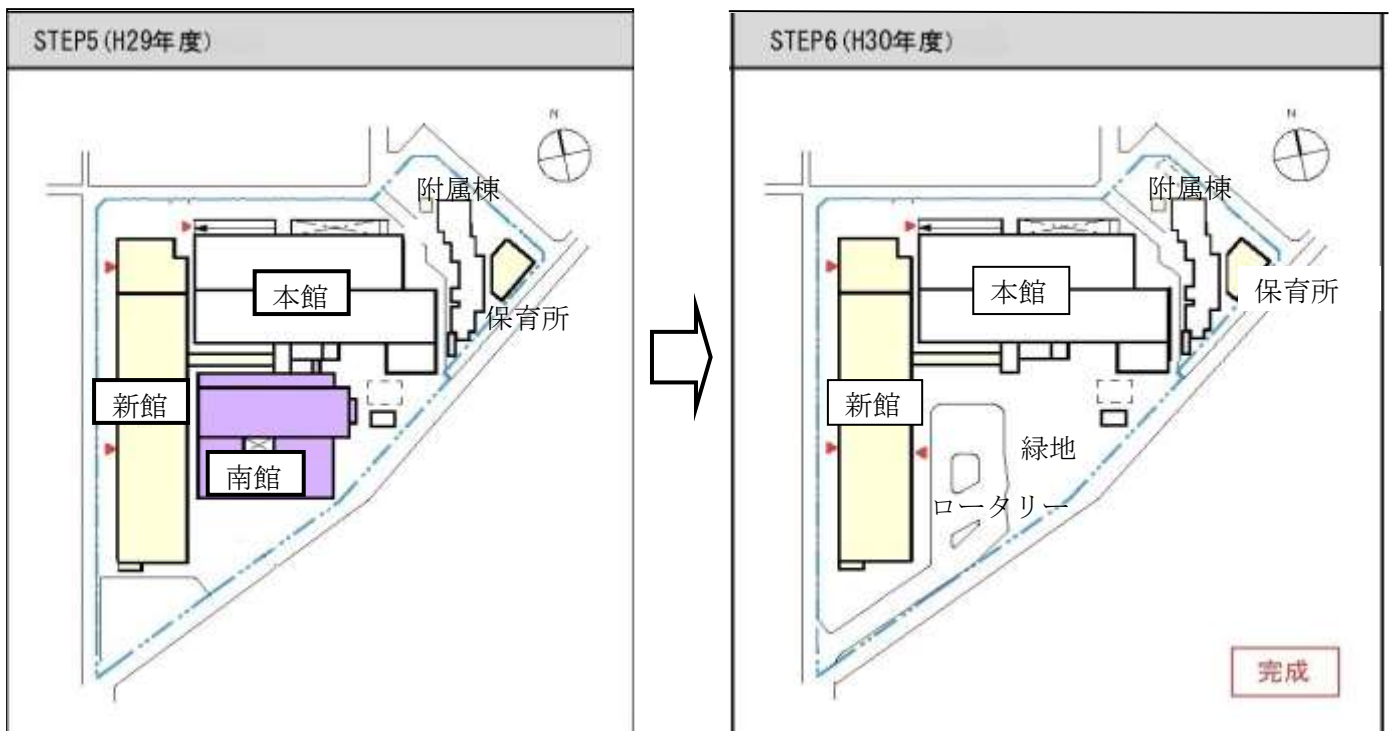

付属棟について

付属棟（旧仮設管理棟）は、耐震性に支障があり、解体する予定でしたが、病診連携室など新たな組織の新設等病院組織の変更による人員増や、保存が必要なカルテの収容スペースの不足などが判明し、費用や工期の観点から、建物を新築するのではなく耐震補強を行って再利用することにしました。

予算は、解体費でまかなうこととしています。

以上
