

# 建設だより

市民病院整備事業地域版 第5号 2013-2



## 整備事業の進捗状況

オイルタンク等移設工事、仮設救急棟建設工事、保育所棟建設工事、仮設管理棟改修工事は全て完了いたしました。また、昨年末の引越・機能移転に関しましては近隣住民の方々にも多大なご協力をいただき無事に完了いたしました。

ありがとうございました。

## 今後の予定


### 旧救急棟と旧管理棟などの解体工事がはじまります

新棟建設部分となる旧救急棟および旧管理棟、旧救急棟南北にある自転車置場、旧保育所棟の解体作業を2月末から開始する予定です。そのため、現在の休日夜間出入口の使用は2月24日(日)までとし、2月25日(月)以降は仮設救急棟北側に変更する予定です。

なお、旧救急棟南北の自転車置場は休日夜間出入口閉鎖と同時期に使用出来なくなります。

患者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、来院される際には公共交通機関等をご利用下さいますようお願いいたします。

(詳細は下図をご覧ください。)

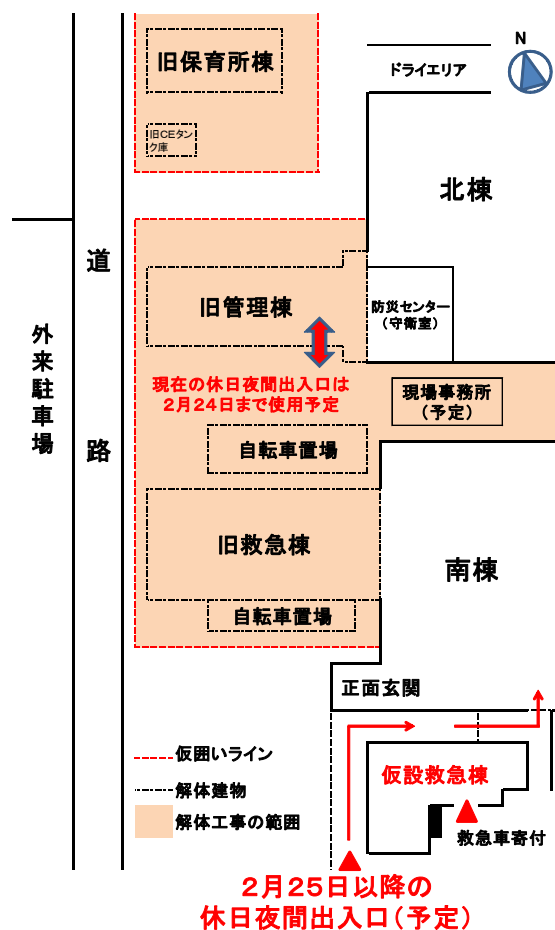


## 仮設バスロータリーの 整備を行います

このたび工事業者が決定し、仮設バスロータリーの工事を開始しました。

約3カ月の工期で仮設バスロータリーとヘルシーロードの整備を行います。

バス停の移転の時期は6月を予定しています。

※移転後は、現在のバスロータリー部分は解体します。

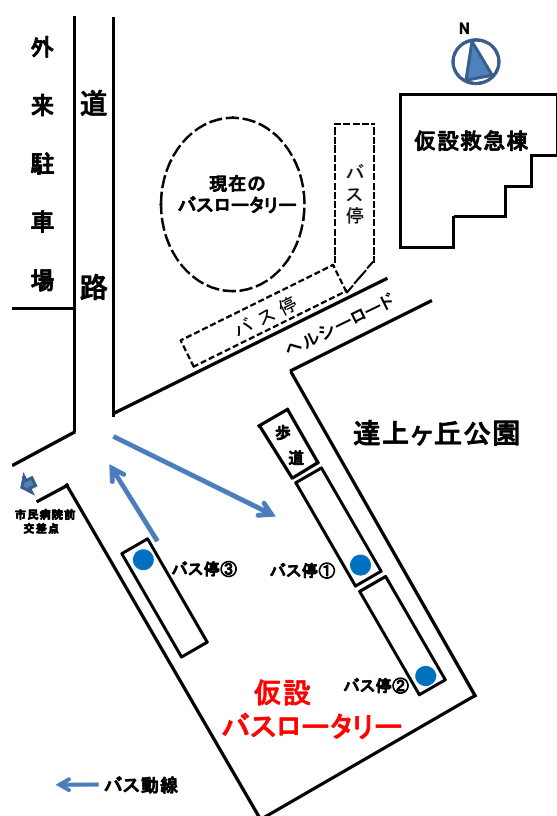

なお、達上ヶ丘公園は工事範囲を除き、これまでどおりご利用いただけます。

工事期間中は万全の安全体制を期し、工事による影響を最小限に抑えるよう作業を進めてまいります。

公園を利用される方および近隣住民の方々におかれましては大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解、ご協力いただけますようお願いいたします。

## 改築推進室より

日頃より整備事業にご理解、ご協力下さりありがとうございます。

今年も新棟完成に向けてさらに整備事業を進めてまいります。

進捗状況等は引き続きこの建設だよりなどで皆様にお知らせしていきます。

今後も何かとご不便、ご迷惑をおかけするかと思っておりますがよろしく  
お願いいたします。



お問い合わせ

〒254-0065

神奈川県平塚市南原1-19-1 平塚市民病院 改築推進室

電話:0463-32-0015 内線 5213、5337

FAX: 0463-31-2847

E-Mail : kaichiku@city.hiratsuka.kanagawa.jp
