

## 建設だより


市民病院整備事業 地域版 第12号 2014・3



## 通学路を整備します



南原小学校に通う児童の安全確保のため、ヘルシーロード（市道南原25号線）を通学路として利用できるよう、花壇部分をアスファルト舗装します。工事期間は約3週間を予定しております。ヘルシーロード利用者の安全を第一に工事を進めていきます。通学路の切り替えは、南原小学校と調整した結果、3月24日（月）から変更します。

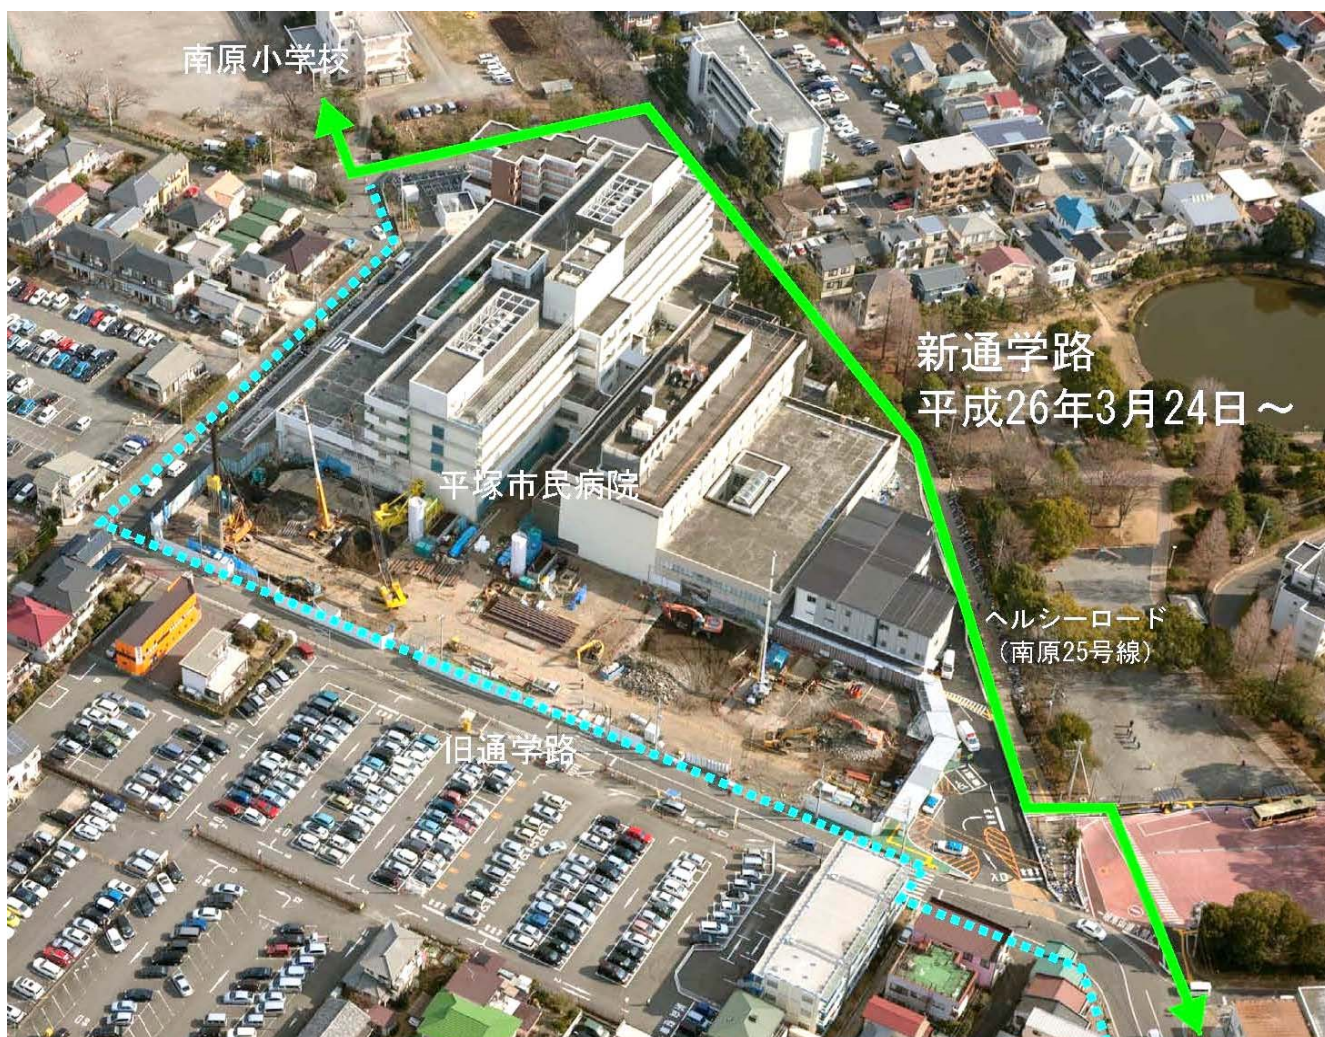

【南原小学校 通学路変更図 撮影日：平成26年1月17日】

## 工事の進捗状況

平成26年2月中に、汚染土壌や地中障害物を掘削除去し、除去した汚染土壌は、土壌汚染対策法に基づき、汚染土壌処理施設へ搬出しました。新棟基礎工事のための山留工事も終了し、現在は建物を支える杭工事（杭本数73本）を行っています。

杭工事が終わると、地下部分を建設するために土の掘削を行い、その地下部分の工事に使う、建設機械を載せる構台（仮設の床）を作ります。構台を作った後、平成26年4月下旬から、新棟の基礎部分を作り始める予定です。


【杭工事の様子 H26.2.17 撮影】



## 新棟建築工事に伴う 下水道工事について

新棟からの排水を、既存の下水管につなぐ工事を行います。工事は4月に行う予定です。

既存道路（市道南原32号線）を掘削するため、通行する際、御迷惑をおかけしますが、御協力をお願いします。近隣にお住まいの方には、事前にお知らせします。

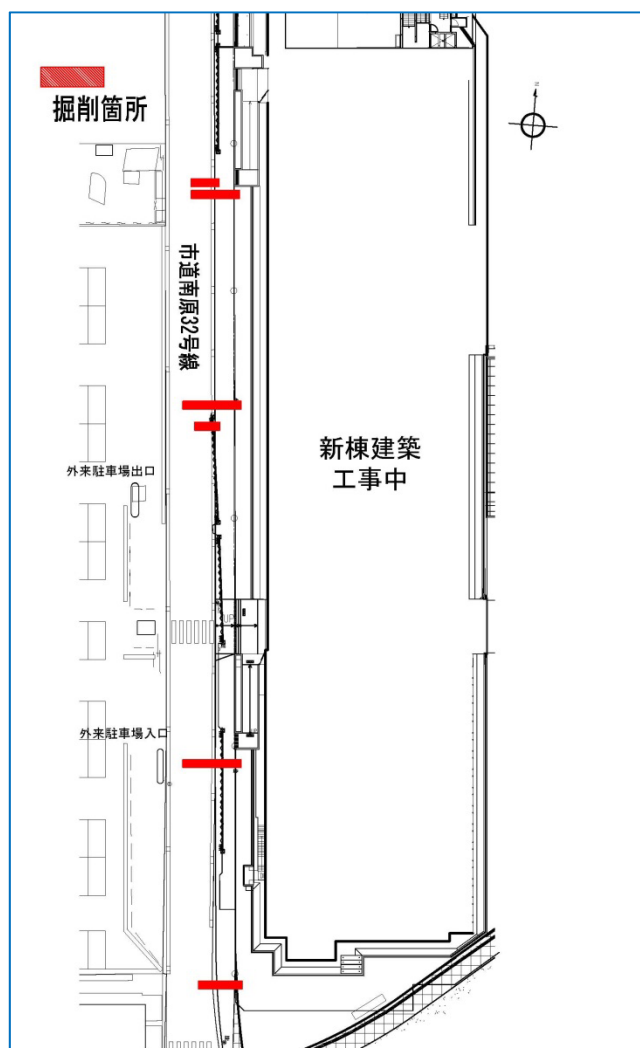

お問い合わせ 平塚市民病院 改築推進室

〒254-0065 神奈川県平塚市南原 1-19-1

電話：0463-32-0015 内線 5213・5337

FAX：0463-31-2847 E-Mail：kaichiku@city.hiratsuka.kanagawa.jp
