

平成28年度事業実績及び平成29年度事業予定

公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度	平成29年度
				完了	事業中	事業予定	事業予定
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備（エレベーター・エスカレーター） 法令点検 12回（月1回） 【12回（月1回）】	昇降設備（エレベーター・エスカレーター） 法令点検 12回（月1回）
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			・平塚駅サービス勉強会 12回 【12回】	平塚駅サービス勉強会 12回
	サービス介助士の資格取得の推進	年3人	【継続】			平塚駅社員資格取得 3人以上 【1人】	平塚駅社員の資格受験
バス事業	ノンステップバスの導入	81両	【長期】			18両（累計41両） 【18両（累計41両）】	24両（累計65両）
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			（実施に向け検討中） 【0箇所】	実施に向けて検討中
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回以上 【12回（月1回）】	1回以上（月次教育で実施）
タクシー事業	UDタクシーの導入	年1台	【長期】			-（導入に向け検討中） 【相模中央交通 2台（福祉タクシー）】	神奈中ハイヤー(株) 2台（日産） 2台（福祉タクシー） 相模中央交通(株) 1台（日産） 5台（トヨタ）
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			12回 【12回】	12回
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			12回 【12回】	12回

道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定 【実績】(3月末時点)	平成29年度 事業予定
				完了	事業中		
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】			370m(累計550m) 【370m(累計550m)】	H28完了
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】			216m + 40m = 256m(累計530m) 【216m + 40m = 256m(累計530m)】	H28完了
6 駅前大通り線 (幹道31号)	巻き込み部改修(セフィウムつきでない)	11箇所	【長期】			-	-
	側溝の床板化	10m	【長期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【長期】			-	-
7 駅前通り線 (幹道47号)	巻き込み部改修(セフィウムつきでない)	15箇所	【中期】			2箇所(累計10箇所) 【2箇所(累計10箇所)】	-
	側溝の床板化	165m	【中期】			-	-
8 南町通東浅間線(幹道34号)	巻き込み部改修(セフィウムつきでない)	44箇所	【短期】			28箇所(累計44箇所) 【28箇所(累計44箇所)】	H28完了
	歩道切り下げ改修(8%超え)	32箇所	【短期】			歩道切り下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、今後の対応方法を検討していく。	歩道切り下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、今後の対応方法を検討していく。
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	550m	【短期】			245m(累計550m) 【245m(累計550m)】	H28完了

9 海岸南中線 (幹道43号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	4箇所	【短期】			-	4箇所(累計4箇所)
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	315m	【短期】			-	315m(累計315m)
	歩道舗装打ち換え(凹凸)	10m	【短期】			-	10m(累計10m)
10 宝町通り線 (幹道30号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	29箇所	【短期】			H27完了	
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	900m	【短期】			H27完了	
11 南町通り線 (幹道32号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	7箇所	【短期】			-	7箇所(累計7箇所)
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	380m	【短期】			-	380m(累計380m)
12 東海道本通り線(幹道29号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	26箇所	【中期】			-	-
13 後谷八幡裏線(幹道28号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	1箇所	【短期】			-	1箇所(累計1箇所)
	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【短期】			-	2箇所(累計2箇所)
	視覚障害者誘導用ブロック改修(破損)	180m	【短期】			H26完了	-

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	歩道舗装打ち換え（滑面平板、C OとA s混在）	380m	【長期】			-	-
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	10箇所	【中期】			-	-
	歩道切り下げ改修（8%超え）	10箇所	【中期】			-	-
15 浅間町3号線	歩道切り下げ改修（8%超え）	7箇所	【中期】			-	-
	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	2箇所	【中期】			-	-
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	10箇所	【短期】			7箇所（累計10箇所） 【7箇所（累計10箇所） 工事中】	7箇所（累計10箇所） 5月末完了予定
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】			1箇所（累計1箇所） 【1箇所（累計1箇所） 工事中】	1箇所（累計1箇所） 5月末完了予定
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】			340m（累計340m） 【220m（累計220m） 工事中】	220m（累計220m） 5月末完了予定 120m（累計340m）
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	12箇所	【短期】			12箇所（累計12箇所） 【12箇所（累計12箇所） 工事中】	12箇所（累計12箇所） 5月末完了予定
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】			315m（累計315m） 【315m（累計315m） 工事中】	315m（累計315m） 5月末完了予定
18 須賀久領平塚中学校線（幹道38号）	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【中期】			-	-

19 三島神社後 谷線（幹道 36号）	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【中期】			-	歩道切り下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、今後の対応方法を検討していく。
	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】			-	630m（累計630m）
20 追分7号線	巻き込み部改修（セパレート舗装でない）	4箇所	【短期】			-	4箇所（累計4箇所）
	歩道切り下げ改修（8%超え）	8箇所	【短期】			-	8箇所（累計8箇所）
	歩道切り下げ改修（乗り入れ部横断部2%超え）	4箇所	【中期】			-	-
	歩道舗装打ち換え（植樹柵隆起のため）	600m	【長期】			-	-

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定 【実績】(3月末時点)	平成29年度 事業予定
				完了	事業中		
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000㎡	【短期】			駐車場改修の決定後、事業を進めていく【駐車場改修に向け、その方策について検討を進めている。】	駐車場改修の方策を決定し、改修を実施する。
	出入口の改善(上記改修事業に含む)	3箇所	【短期】			駐車場改修の決定後、事業を進めていく【駐車場改修に向け、その方策について検討を進めている。】	駐車場改修の方策を決定し、改修を実施する。
	園路の改善(勾配)	20m	【中期】			なだらかな勾配の取れるルートを検討していく【勾配の頂点付近に迂回を促す案内表示を設置し、バリアフリーに配慮した対応をとることとした。】	平成28年度に実施した対応にて、改善・対応済といたしたい。
	トイレの改善(出入口)	3箇所	【中期】			動きの重いトイレドアについて注油し、動きの悪いものは改修を行う【適宜必要な個所に注油し対応した。】	動きの重いトイレドアについて注油し、動きの悪いものは改修を行う
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700㎡	【中期】			全体構想での位置付けが決定後、事業を進めていく【「ひらつか海岸エリア魅力アップチャレンジ」(平成28年5月25日策定)の湘南海岸公園の施設整備の方向性に準じ、事業を進めていくことになった。】	園路の一部をバリアフリー化する予定

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定 【実績】(3月末時点)	平成29年度 事業予定
				完了	事業中		
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。【随時実施】	点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			2回(6月、10月)【2回】 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施	2回 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			<ul style="list-style-type: none"> 各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。【随時実施】 交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。【交通安全教室・講話 96回実施】 各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、多発傾向にある自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。【随時実施】 警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。【随時実施】 	<ul style="list-style-type: none"> 各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。 交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。 各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、多発傾向にある自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。 警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度 事業予定 【実績】(3月末時点)	平成29年度 事業予定
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			6回 【2回】	4回
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回 【1回】	1回
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回 【1回】	1回
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回 【1回】	1回
平塚輪駅対周辺の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			- 【-】	-
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回 【7回】	7回
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年で実施 【通年で実施】	通年で実施
安歩全行対策の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】			H26完了	
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			0.5km(南町通東浅間線)(累計1.5km) 【0.7km(南町通東浅間線、八重咲町袖ヶ浜線)(累計1.3km)】	0.2km(海岸南中線)(累計1.5km)
心のバリアフリー(手助け)	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回以上	【継続】			2回 【2回】	2回
	疑似・点字・誘導体験の実施	年45回	【継続】			45回 【77回】	疑似・点字・誘導・手話体験の実施 90回

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成28年度	平成29年度
				完了	事業中	事業予定	事業予定
心のバリアフリー（ 理解、手助け、 情報提供、 利用） を妨げない	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			1回 【1回】	1回
	生活関連施設等の各ホームページにおけるバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			10施設（累計17施設） 【9施設（累計16施設）】	10施設（累計26施設）
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			バリアフリーマップ素案の検討 【バリアフリーマップ素案の検討】	バリアフリーマップ素案の作成
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			1回 平成28年5月開催の商店会長会議において配布。11月25日にスターモールで平塚警察署と合同で配布指導 【2回】	1回 平成29年5月開催予定の商店会長会議において配布予定
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 商店会長会議（5/20開催）で資料の配布と活動事例等を紹介し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。 【1回】	1回 商店会長会議（5/25開催予定）で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回 【4回】	3回
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【短期】			設置10箇所、修繕15箇所 庁内関係課の意見も踏まえ、本体の修繕や表示内容等の更新を実施予定。 【設置0箇所、修繕0箇所】 公共サインの修繕等の実施に向け、「公共施設景観ガイドライン（歩行者系公共サイン）」の一部改訂を行いました。また、設置（1箇所）、修繕（15箇所）工事に向け手続きを進めましたが、年度内に工事が完了しないため、平成29年度に繰り越しました。	設置1箇所、修繕15箇所（7月完了予定） また、平成30年度以降に総合公園及び平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画している公共サインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ検討します。
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【短期】				


道路特定事業

路線名	県道606号(大島明石)	事業者	神奈川県
事業区間	八幡宮前～平塚市総合公園	区間延長	1460m
事業内容	歩道の段差を改善します。(大原交差点～平塚市総合公園)		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
歩道の段差改善	550m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		90m	90m	370m					
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

事業詳細

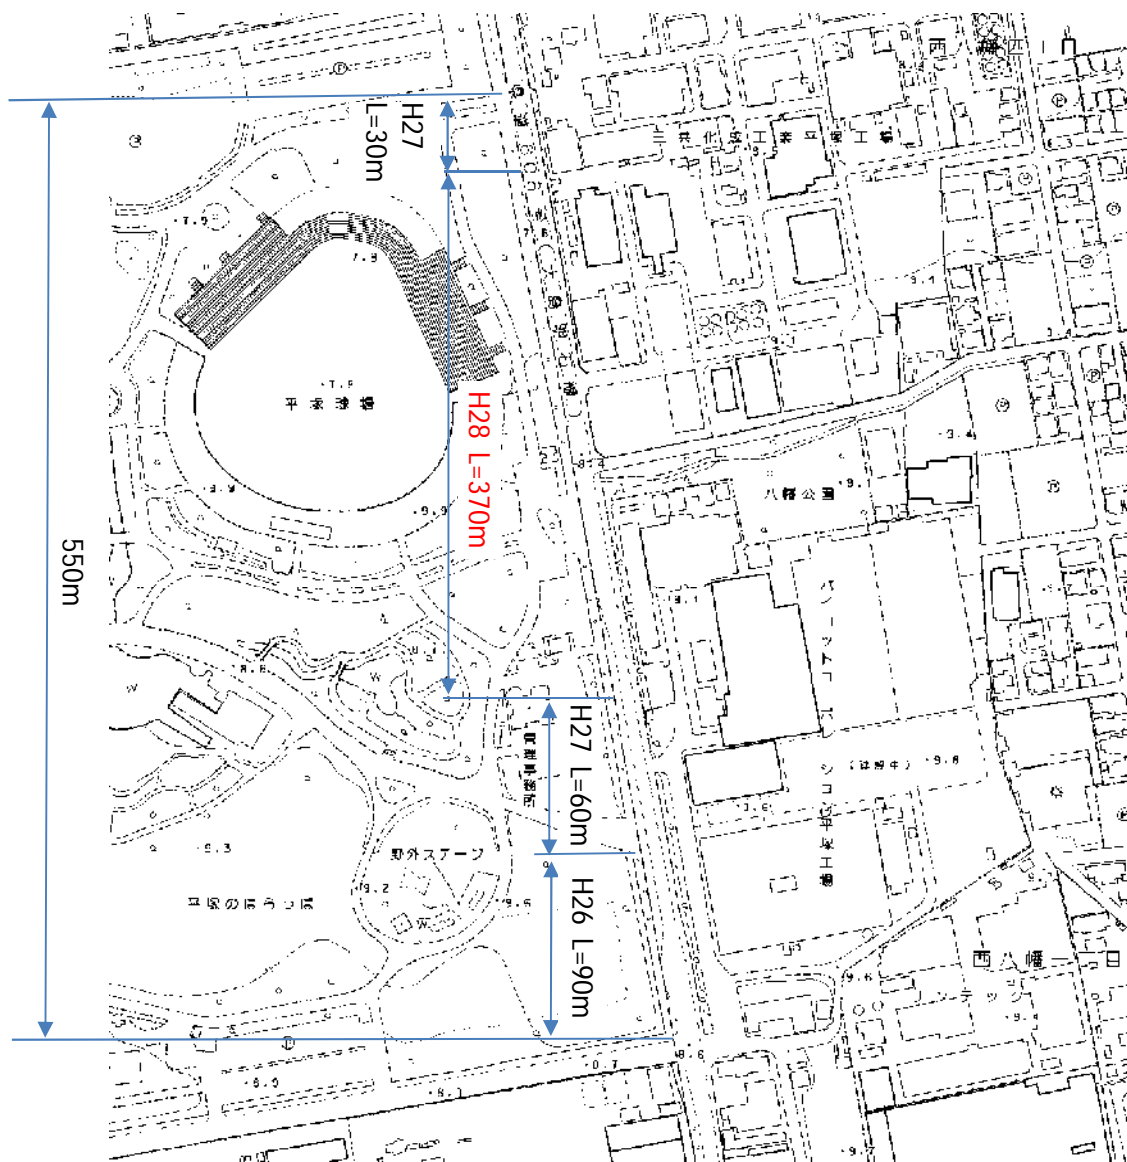

道路特定事業

路線名	県道608号(平塚停車場袖ヶ浜)	事業者	神奈川県						
事業区間	平塚駅南口~平塚駅南口入口交差点	区間延長	1220m						
事業内容	視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 (ふれあい平塚ホスピタル~平塚駅南口入口交差点)								
事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

事業詳細



道路特定事業

路線名	駅前通り線（幹道47号）	事業者	平塚市
事業区間	宮の前交差点 ～ 県合同庁舎前交差点	区間延長	603m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 側溝蓋等は、杖等が落ち込まない構造に改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	15箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		4	4	2					
側溝の床板化	165m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化につきましては、路線の全体事業に合わせて進めていく予定です。

事業詳細

平成28年度整備箇所
巻き込み部改修
... 2箇所

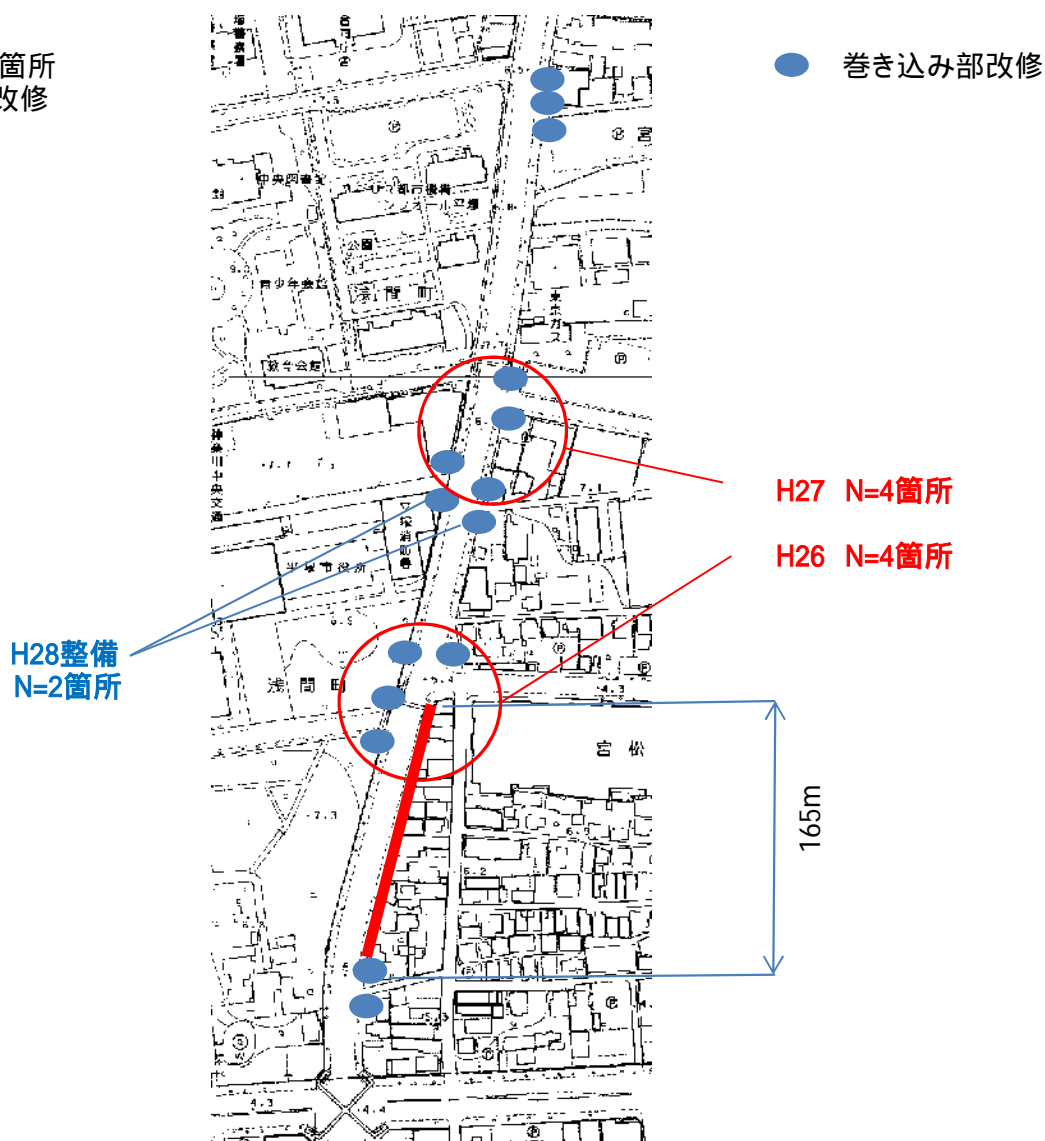

路線名	南町通東浅間線（幹道34号）	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ~ 平塚駅花水線	区間延長	713m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	44箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	16	28					
歩道切り下げ改修（8%超え）	32箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	305	245					

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

平成28年度整備箇所
 巻き込み部改修
 ... 28箇所
 視覚障害者誘導用ブロック改修
 ... 245m

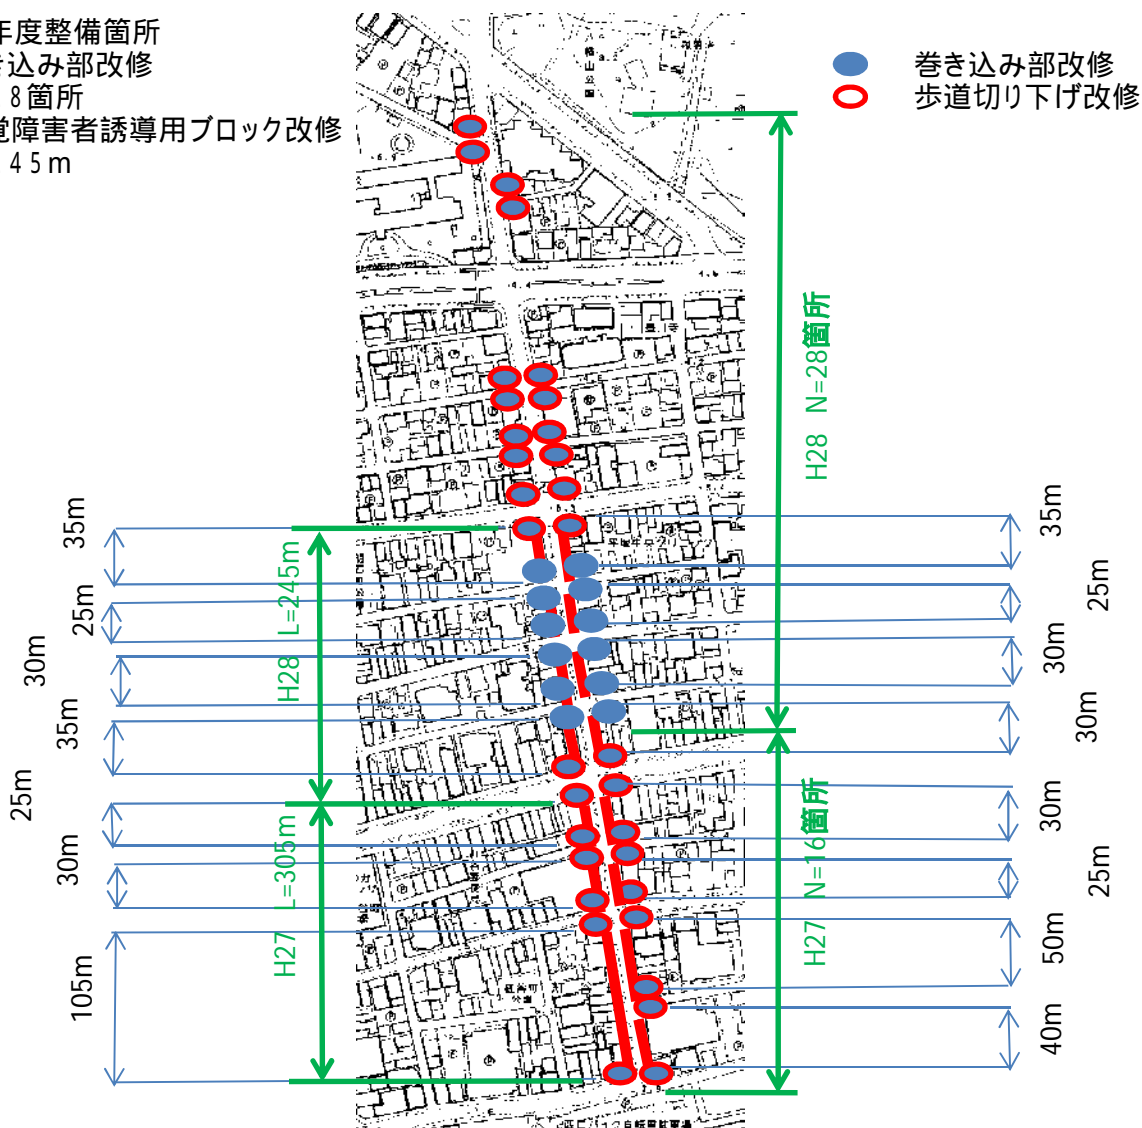


道路特定事業

路線名	海岸南中線（幹道43号）	事業者	平塚市
事業区間	市民プラザ前交差点 ~ 平塚駅花水線	区間延長	216m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	4箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					

事業実施に際し配慮すべき事項

事業詳細

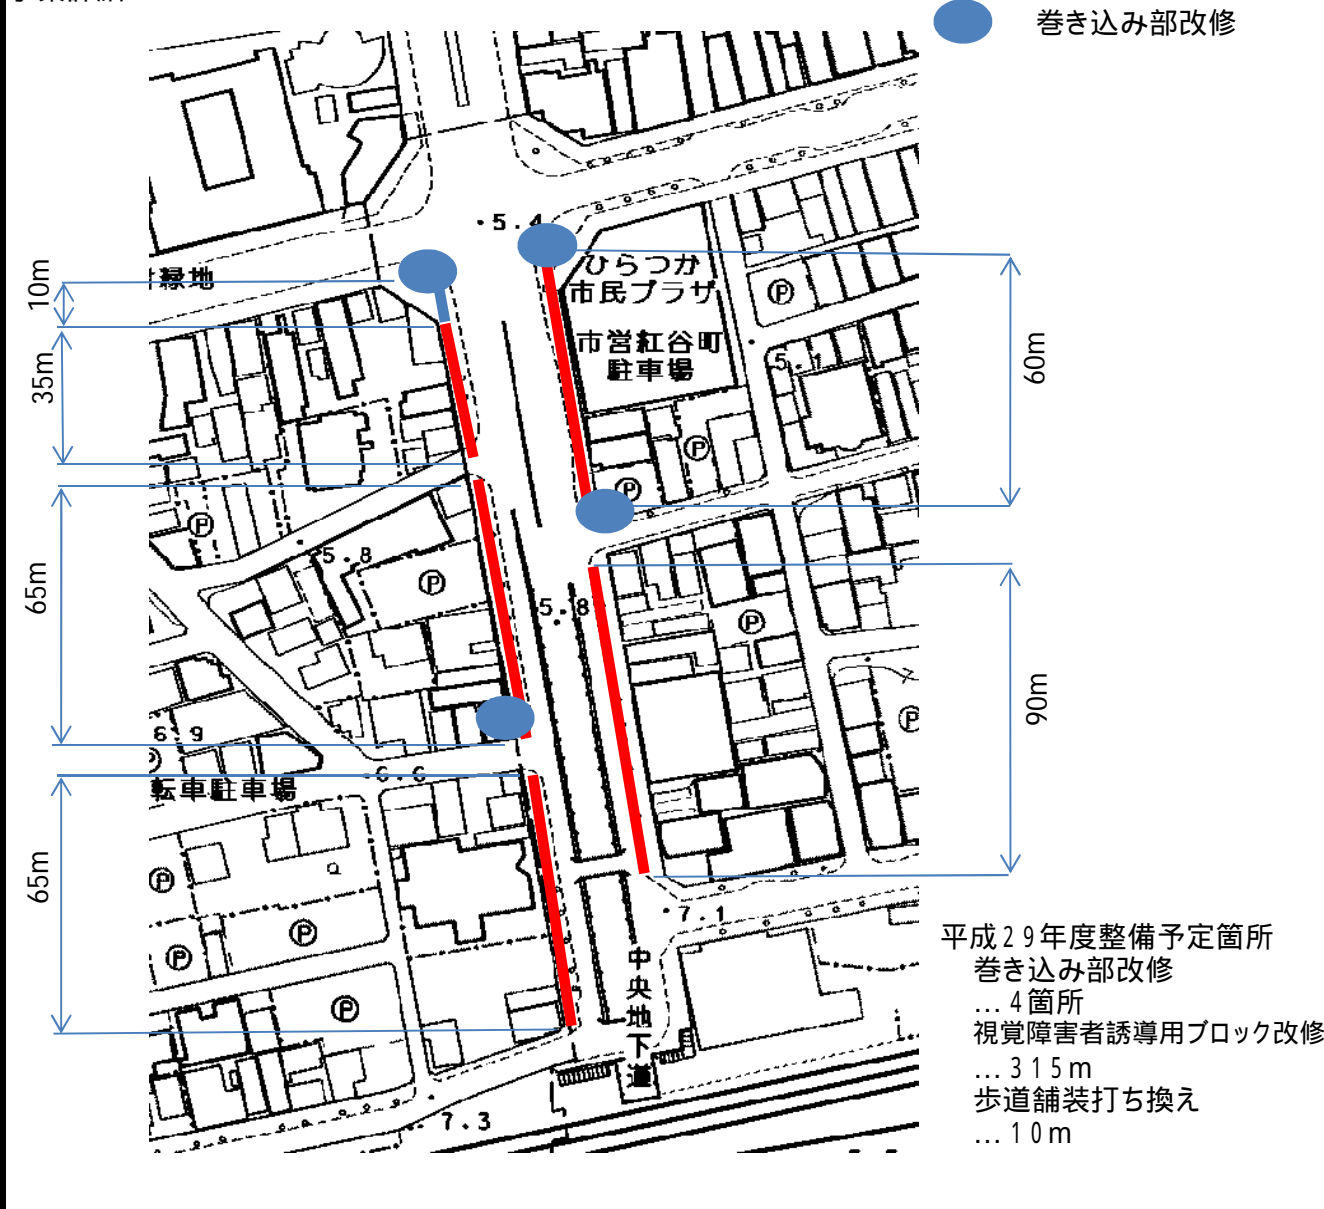

路線名	南町通り線（幹道32号）	事業者	平塚市
事業区間	平塚駅北口駅前広場 ～ 南町通東浅間線	区間延長	215m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	7箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細



● 巻き込み部改修

平成29年度整備予定箇所
 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）
 ... 7箇所
 視覚障害者誘導用ブロック設置
 ... 380m


路線名	後谷八幡裏線(幹道28号)	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ~ 平塚市役所前交差点	区間延長	347m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修(セーフティゴムつきでない)	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
視覚障害者誘導用ブロック改修(破損)	180m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		180							
歩道舗装打ち換え(滑面平板、COとAs混在)	380m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

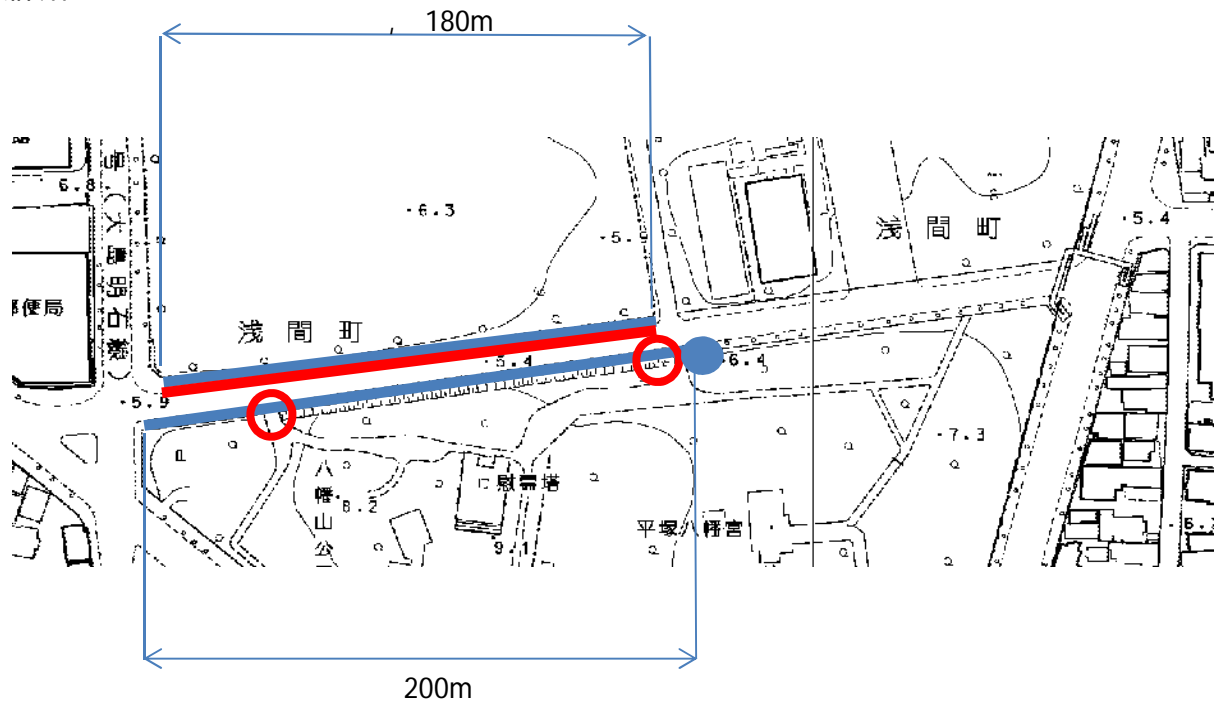

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修

平成29年度整備予定箇所
 巻き込み部改修(セーフティゴムつきでない)
 ... 1箇所
 歩道切り下げ改修
 ... 2箇所


路線名	平塚駅花水線（幹道35号）	事業者	平塚市
事業区間	海岸南中線 ~ 南町通東浅間線	区間延長	195m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	10箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	3	7					
歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	1					
視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	220					

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

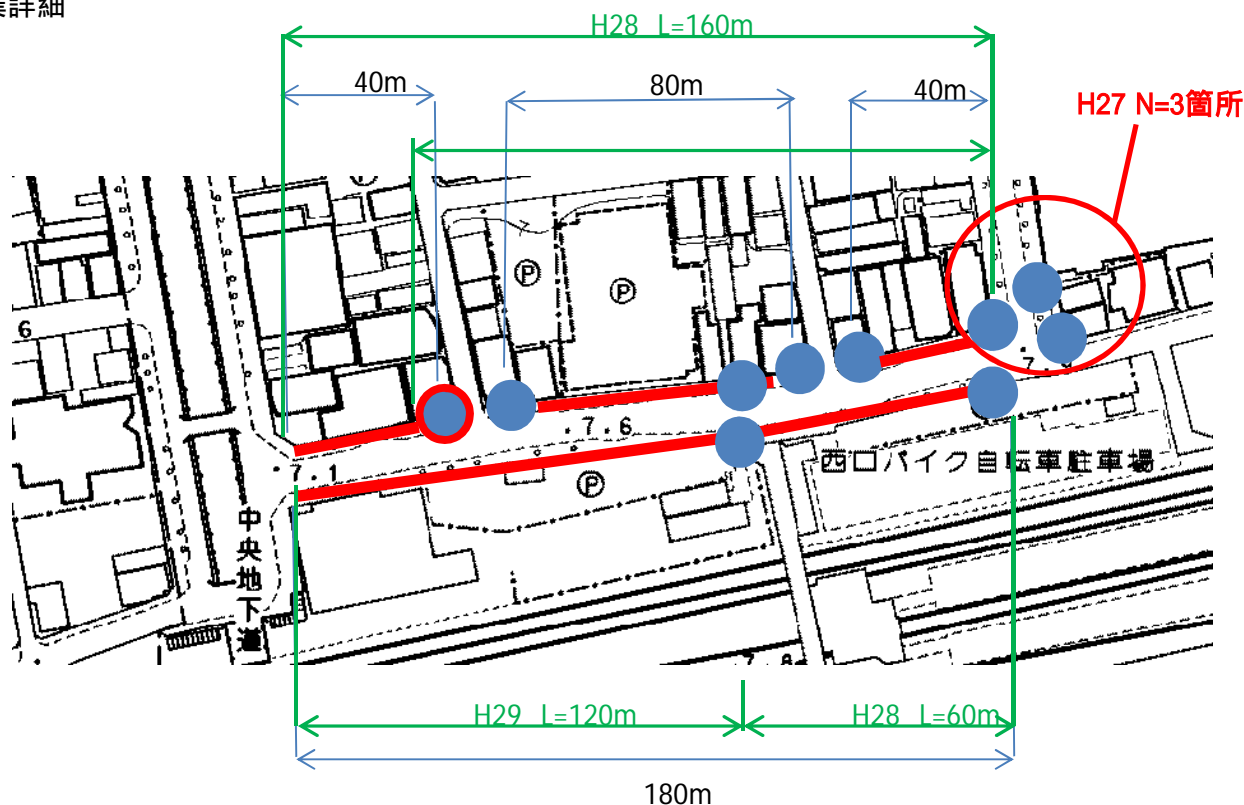

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修

平成28年度整備箇所
 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）
 ... 7箇所
 歩道切り下げ改修（8%超え）
 ... 1箇所
 視覚障害者誘導用ブロック設置
 ... 220m

平成29年度整備予定箇所
 視覚障害者誘導用ブロック設置
 ... 120m


路線名	八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	事業者	平塚市
事業区間	平塚駅南口駅前広場 ～ 須賀打越羽衣町線	区間延長	191m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	12箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

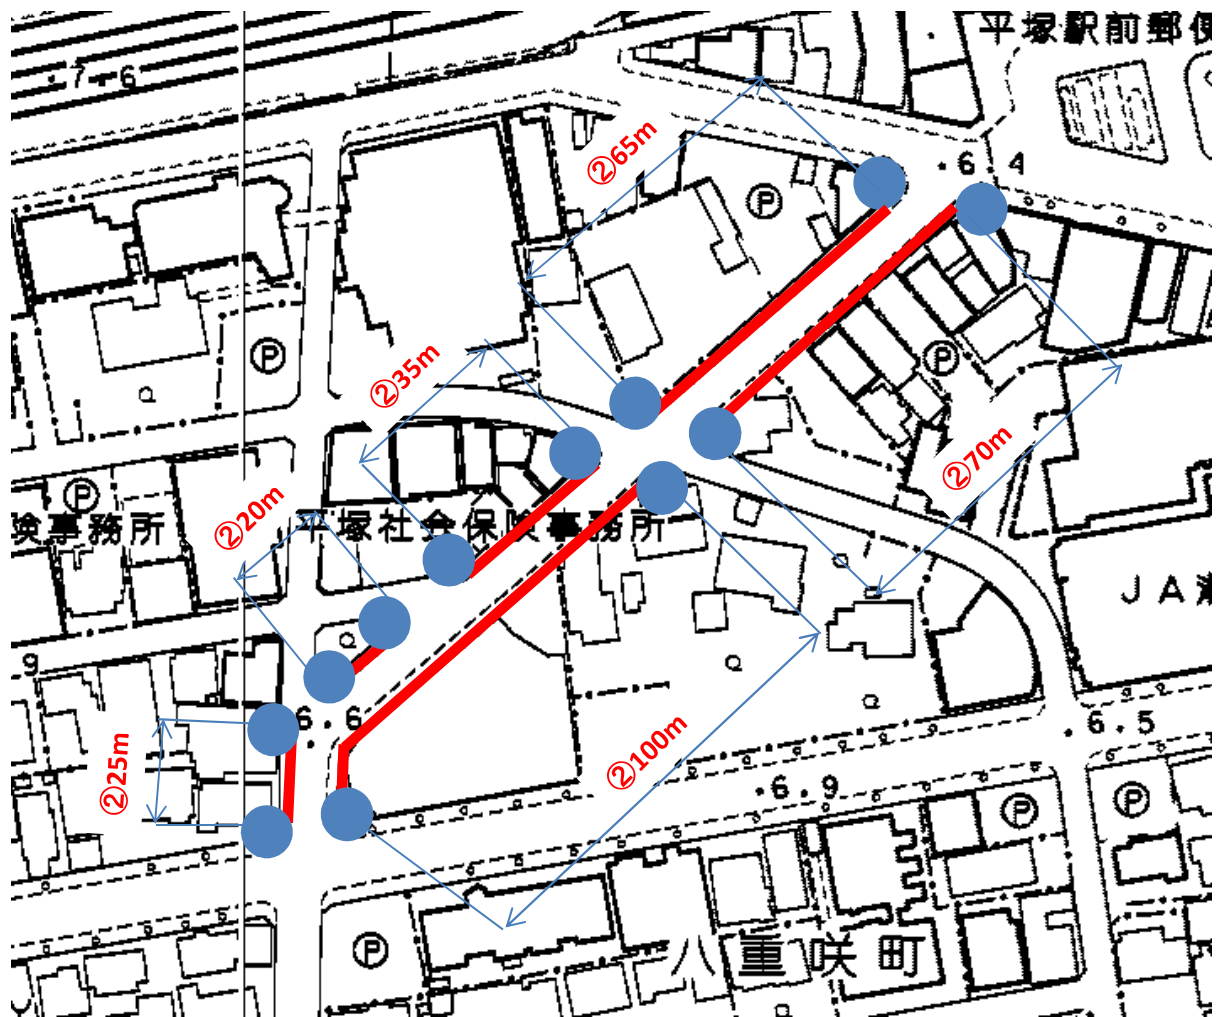

● 巻き込み部改修

平成28年度整備箇所
 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）
 ... 12箇所
 視覚障害者誘導用ブロック設置
 ... 315m

道路特定事業

路線名	三島神社後谷線（幹道36号）	事業者	平塚市
事業区間	須馬踏切 ~ モータースクール前交差点	区間延長	433m
事業内容	切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。

事業詳細

平成29年度整備予定箇所
視覚障害者誘導用ブロック設置
... 630m

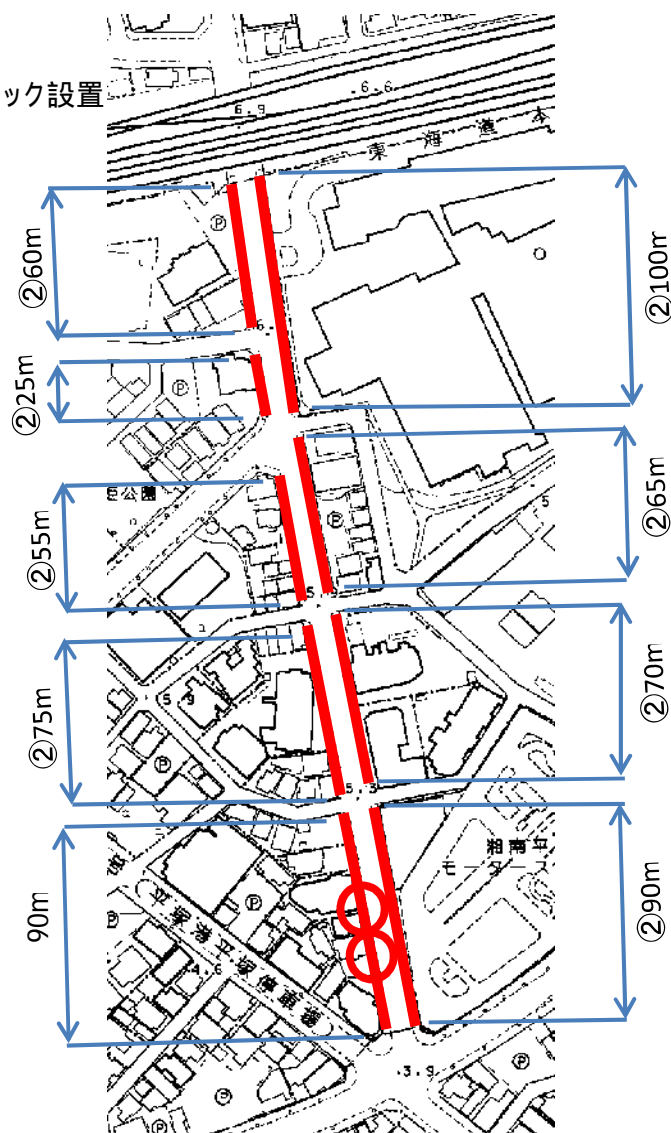

○ 歩道切り下げ改修


路線名	追分7号線	事業者	平塚市
事業区間	平塚ろう学校前交差点 ~ 大原交差点	区間延長	816m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修(セーフティゴムつきでない)	4箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道切り下げ改修(8%超え)	8箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道舗装打ち換え(植樹柵隆起のため)	600m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

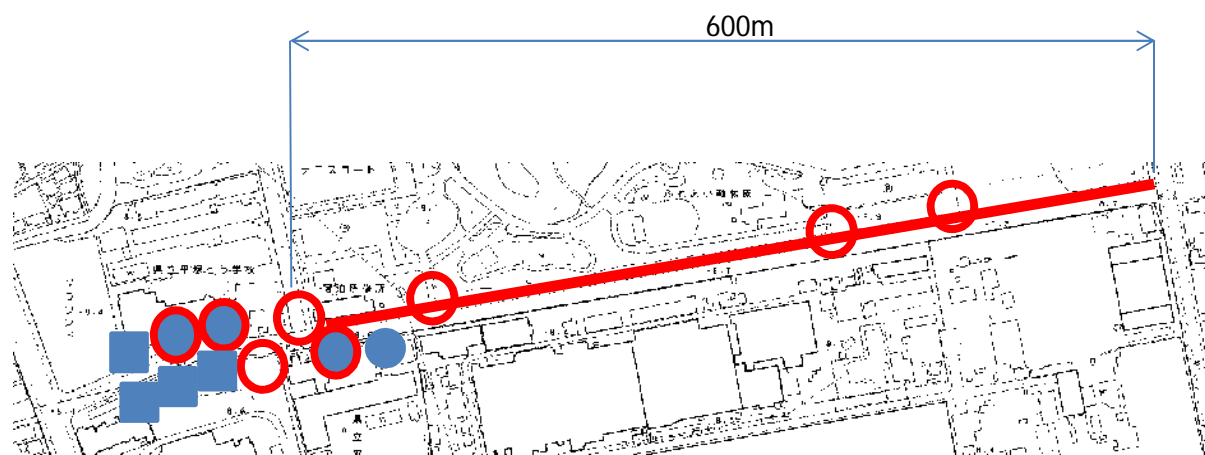

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修(8%超え)
- 歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)

平成29年度整備予定箇所
 巻き込み部改修(セーフティゴムつきでない)
 ... 4箇所
 歩道切り下げ改修(8%超え)
 ... 8箇所

平塚市総合公園 園路の改善 位置図

