

## 平成29年度事業予定及び進捗状況

## 公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度 事業予定	平成29年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回)	4月～9月(6回)実施済
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			平塚駅サービス勉強会 12回	月1回の勉強会を実施済
	サービス介助士の資格取得の推進	年3人	【継続】			平塚駅社員の資格受験	「新規資格取得者の養成」、「資格保持者へのブラッシュアップ」の2種類の研修を実施
バス事業	ノンステップバスの導入	81両	【長期】			24両(累計65両)	9両導入済み(累計50両) 12月4両、1月4両、2月3両、3月4両 H29年度、計24両導入予定
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			実施に向けて検討中	1箇所:ベンチ設置予定(10月) 農協神田支所前バス停(本厚木駅向き)
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回以上(月次教育で実施)	6回(月1回実施)
タクシー事業	UDタクシーの導入	年1台	【長期】			神奈中ハイヤー(株) 2台(日産) 2台(福祉タクシー) 相模中央交通(株) 1台(日産) 5台(トヨタ)	相模中央交通(株) 1台(日産)
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			12回	地区会の開催、随時各社との情報共有、連携
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			12回	各社、月1回以上の乗務員教育の実施

## 道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度 事業予定	平成29年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> <li>・現況でのEVの設置検討</li> <li>・現況での斜路付き階段の設置検討</li> <li>・平面横断経路の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現況でのEVの設置検討</li> <li>・現況での斜路付き階段の設置検討</li> <li>・平面横断経路の検討</li> </ul>
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】			-	-
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】			-	-
6 駅前大通り線 (幹道31号)	巻き込み部改修(セフィウムつきでない)	11箇所	【長期】			-	-
	側溝の床板化	10m	【長期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【長期】			-	-
7 駅前通り線 (幹道47号)	巻き込み部改修(セフィウムつきでない)	15箇所	【中期】			-	-
	側溝の床板化	165m	【中期】			-	-
8 南町通東浅間線(幹道34号)	巻き込み部改修(セフィウムつきでない)	44箇所	【短期】			-	-
	歩道切り下げ改修(8%超え)	32箇所	【短期】			歩道切り下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、今後の対応方法を検討していく。	歩道切り下げ勾配の改修は、短期事業計画箇所の整備が完了した後、個々の現場条件に応じた対応可能な整備方法を関係団体と調整してまいります。
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	550m	【短期】			-	-

9 海岸南中線 (幹道43号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	4箇所	【短期】			4箇所(累計4箇所)	4箇所(累計4箇所) 施工中
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	315m	【短期】			315m(累計315m)	315m(累計315m) 施工中
	歩道舗装打ち換え(凹凸)	10m	【短期】			10m(累計10m)	10m(累計10m) 施工中
10 宝町通り線 (幹道30号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	29箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	900m	【短期】			-	-
11 南町通り線 (幹道32号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	7箇所	【短期】			7箇所(累計7箇所)	7箇所(累計7箇所) 10月下旬頃より工事着手予定
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	380m	【短期】			380m(累計380m)	380m(累計380m) 10月下旬頃より工事着手予定
12 東海道本通り線(幹道29号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	26箇所	【中期】			-	-
13 後谷八幡裏線(幹道28号)	巻き込み部改修(セフィロムつきでない)	1箇所	【短期】			1箇所(累計1箇所)	1箇所(累計1箇所) 施工中
	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【短期】			2箇所(累計2箇所)	2箇所(累計2箇所) 施工中
	視覚障害者誘導用ブロック改修(破損)	180m	【短期】			-	-

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	歩道舗装打ち換え（滑面平板、C OとA s混在）	380m	【長期】			-	-
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	10箇所	【中期】			-	-
	歩道切り下げ改修（8%超え）	10箇所	【中期】			-	-
15 浅間町3号線	歩道切り下げ改修（8%超え）	7箇所	【中期】			-	-
	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	2箇所	【中期】			-	-
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	10箇所	【短期】			7箇所（累計10箇所） 5月末完了予定	7箇所（累計10箇所） 完了
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】			1箇所（累計1箇所） 5月末完了予定	1箇所（累計1箇所） 完了
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】			220m（累計220m） 5月末完了予定 120m（累計340m）	220m（累計220m） 完了 120m（累計340m） 施工中
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セフィロムつきでない）	12箇所	【短期】			12箇所（累計12箇所） 5月末完了予定	12箇所（累計12箇所） 完了
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】			315m（累計315m） 5月末完了予定	315m（累計315m） 完了
18 須賀久領平塚中学校線（幹道38号）	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【中期】			-	-

19 三島神社後 谷線（幹道 36号）	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【中期】			歩道切り下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、今後の対応方法を検討していく。	-
	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】		-	630m（累計630m）	国の交付金を活用して整備を行っており、平成30年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
20 追分7号線	巻き込み部改修（セパレート舗装つきでない）	4箇所	【短期】		-	4箇所（累計4箇所）	国の交付金を活用して整備を行っており、短期の事業計画期間内に未整備の箇所は、平成30年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
	歩道切り下げ改修（8%超え）	8箇所	【短期】		-	8箇所（累計8箇所）	国の交付金を活用して整備を行っており、短期の事業計画期間内に未整備の箇所は、平成30年度以降に早期完了に向け、順次整備予定です。
	歩道切り下げ改修（乗り入れ部横断部2%超え）	4箇所	【中期】			-	-
	歩道舗装打ち換え（植樹柵隆起のため）	600m	【長期】			-	-

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度 事業予定	平成29年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000㎡	【短期】			駐車場改修の方策を決定し、改修を実施する。	駐車場改修の方策について検討中。
	出入口の改善(上記改修事業を含む)	3箇所	【短期】			駐車場改修の方策を決定し、改修を実施する。	駐車場改修の方策について検討中。
	園路の改善(勾配)	20m	【中期】			-	-
	トイレの改善(出入口)	3箇所	【中期】			動きの重いトイレドアについて注油し、動きの悪いものは改修を行う	定期的に点検を実施
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700㎡	【中期】			園路の一部をバリアフリー化する予定	下半期に園路の一部にスロープを設置予定。

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度 事業予定	平成29年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。	・重点整備地区内の付加装置付信号機29箇所(含む高齢者等感応付信号機)については全て点検済。 ・横断歩道、標識等の補修については、随時上申中。
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			2回 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施	6月を取締り強化期間として実施した。2回目は10月にパトロール隊と合同で実施予定。
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			・各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。 ・交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。 ・各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、多発傾向にある自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。 ・警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。	・キャンペーンについては、各季の交通安全運動期間を中心に実施。 ・交通マナー向上のため、交通安全教室、チリリンスクール、交通安全講話等を学校、企業等において随時開催。 ・交通安全日、各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中に交差点での交通監視活動、街角アドバイスを実施。 ・警察署ホームページ、FM湘南ナパサ等を活用した広報啓発活動を実施。


道路特定事業

路線名	海岸南中線（幹道43号）	事業者	平塚市
事業区間	市民プラザ前交差点 ~ 平塚駅花水線	区間延長	216m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	4箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					

事業実施に際し配慮すべき事項

事業詳細

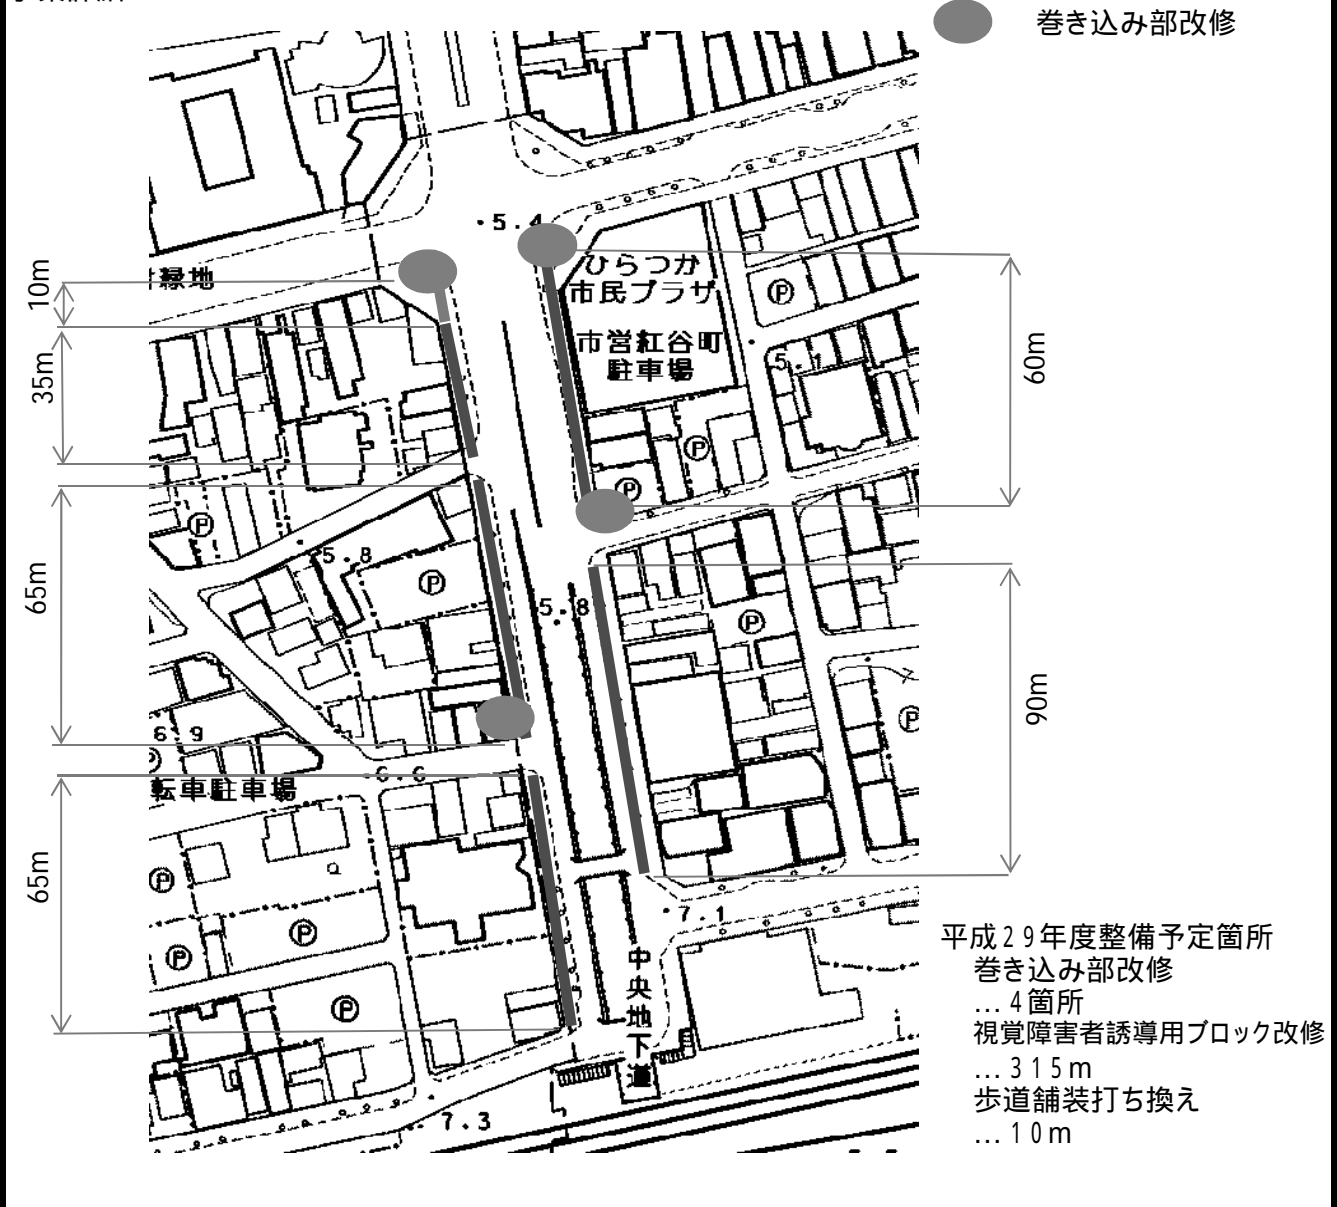

道路特定事業

路線名	南町通り線（幹道32号）	事業者	平塚市
事業区間	平塚駅北口駅前広場 ～ 南町通東浅間線	区間延長	215m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	7箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細



● 巻き込み部改修

平成29年度整備予定箇所  
 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）  
 ... 7箇所  
 視覚障害者誘導用ブロック設置  
 ... 380m



道路特定事業


路線名	後谷八幡裏線（幹道28号）	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ～ 平塚市役所前交差点	区間延長	347m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		180							
歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	380m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

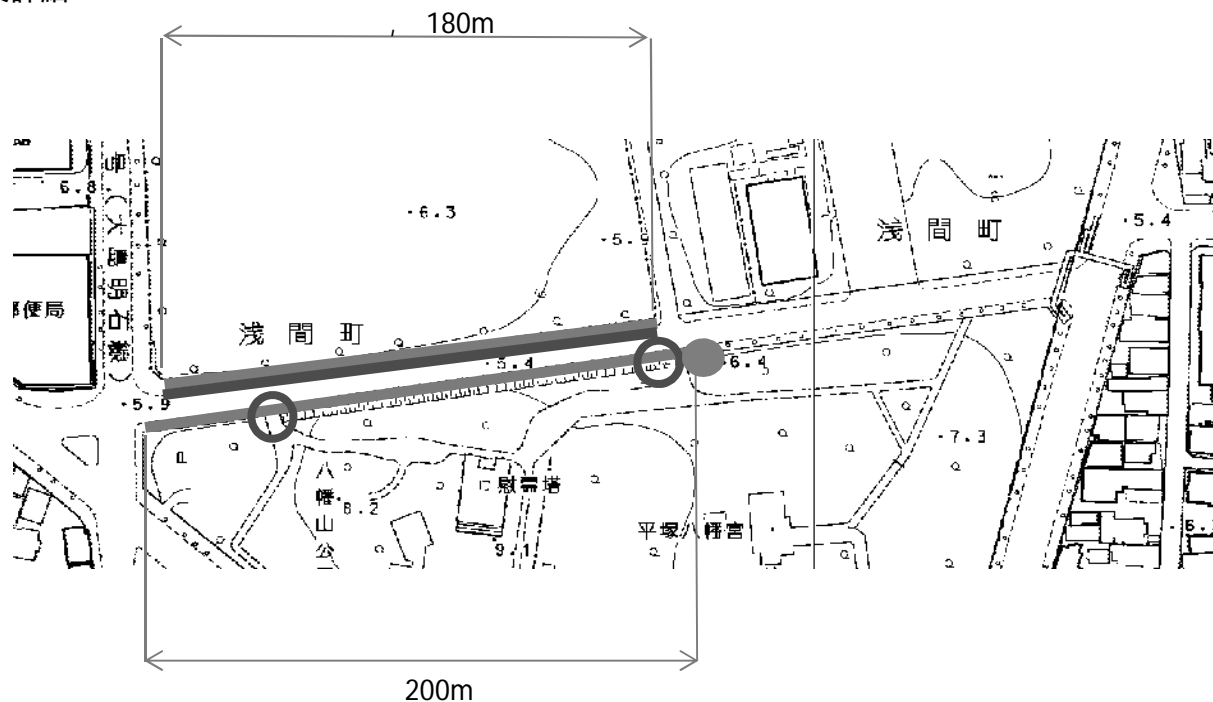

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修

平成29年度整備予定箇所  
 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）  
 … 1箇所  
 歩道切り下げ改修  
 … 2箇所


路線名	平塚駅花水線（幹道35号）	事業者	平塚市
事業区間	海岸南中線 ~ 南町通東浅間線	区間延長	195m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	10箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	3	7					
歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	1					
視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	220					

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

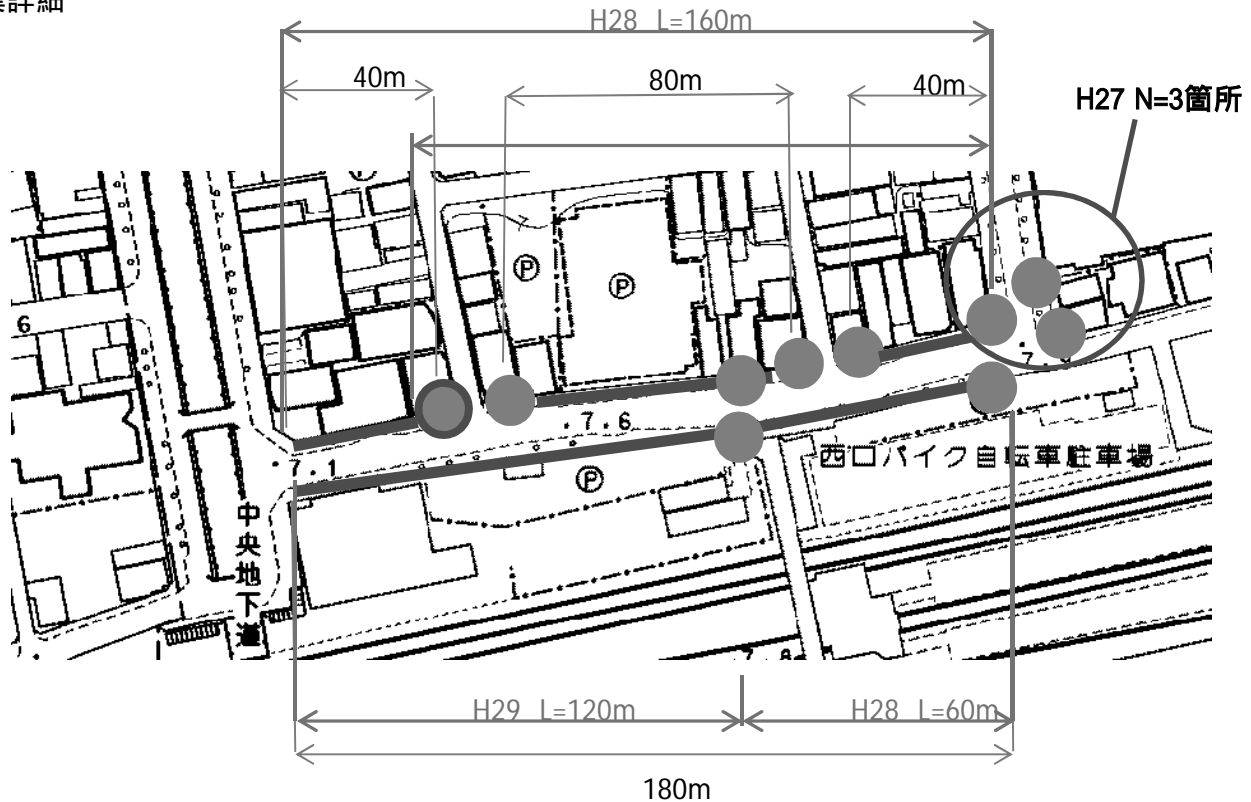

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修

平成28年度整備箇所  
 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）  
 ... 7箇所  
 歩道切り下げ改修（8%超え）  
 ... 1箇所  
 視覚障害者誘導用ブロック設置  
 ... 220m

平成29年度整備予定箇所  
 視覚障害者誘導用ブロック設置  
 ... 120m

路線名	三島神社後谷線（幹道36号）	事業者	平塚市
事業区間	須馬踏切 ~ モータースクール前交差点	区間延長	433m
事業内容	切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。

事業詳細

平成29年度整備予定箇所  
 視覚障害者誘導用ブロック設置  
 ... 630m

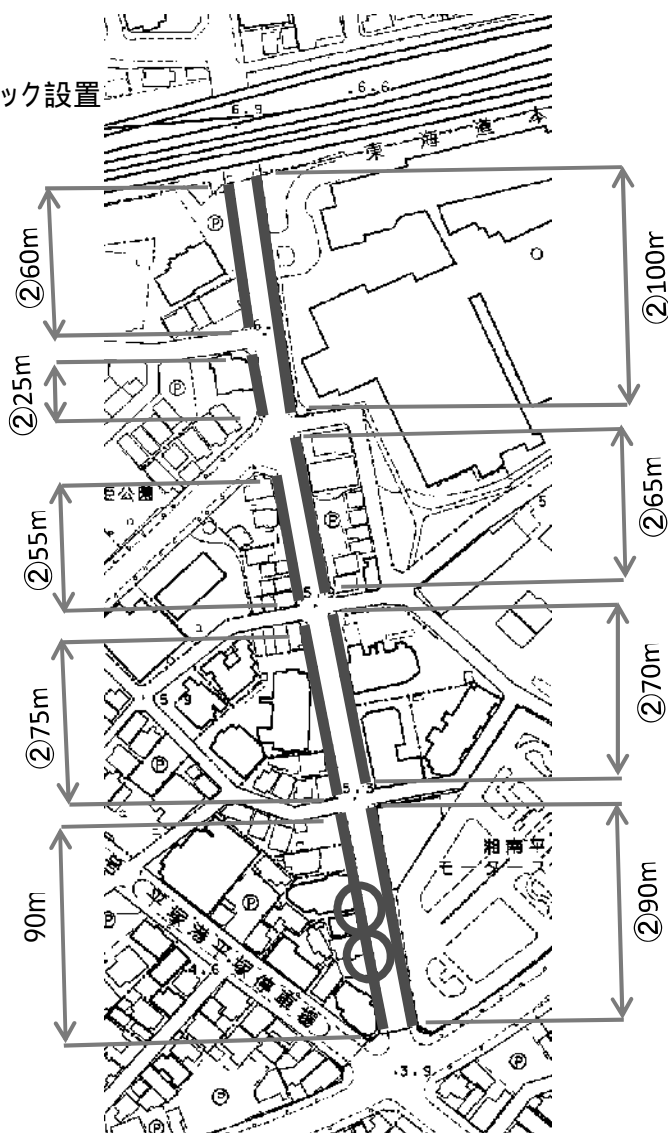

○ 歩道切り下げ改修


路線名	追分7号線	事業者	平塚市
事業区間	平塚ろう学校前交差点 ~ 大原交差点	区間延長	816m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修(セーフティゴムつきでない)	4箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道切り下げ改修(8%超え)	8箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					
歩道舗装打ち換え(植樹柵隆起のため)	600m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-					

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

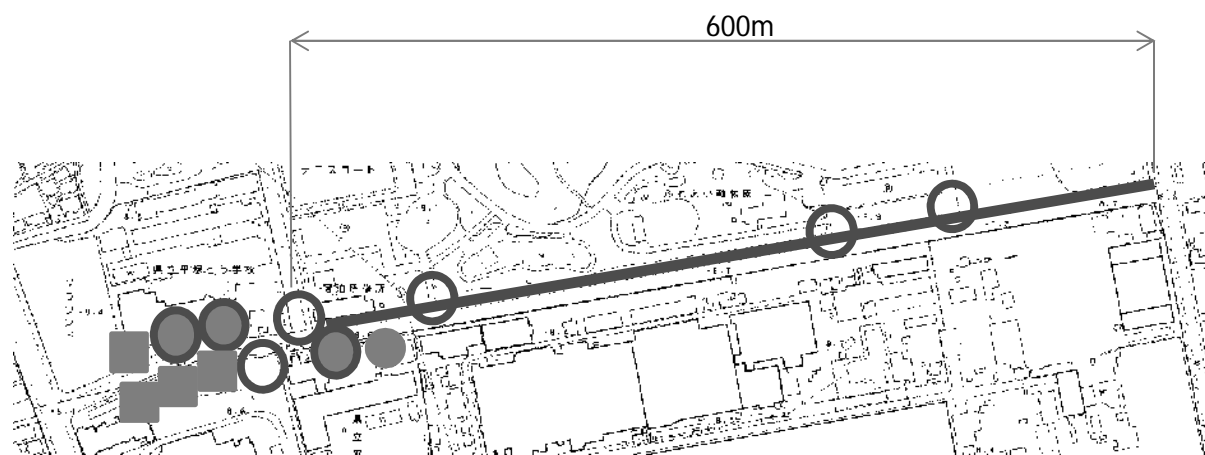

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修(8%超え)
- 歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)

平成29年度整備予定箇所  
 巻き込み部改修(セーフティゴムつきでない)  
 ... 4箇所  
 歩道切り下げ改修(8%超え)  
 ... 8箇所

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度 事業予定	平成29年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			4回	2回
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	1回
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	1回
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回	0回
平塚駅駐輪場対策の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			-	-
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回	10月の「放置自転車クリーンキャンペーン」とあわせて、市内全8高等学校で実施予定
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年で実施	通年で実施中
安歩全行対策の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】			-	-
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			0.2km(海岸南中線)(累計1.5km)	12月以降 整備予定
心のバリアフリー(手助け)	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回以上	【継続】			2回	「障害者週間」期間中の障がい福祉事業所製品展示即売会等において啓発活動を展開予定
	疑似・点字・誘導体験の実施	年45回	【継続】			疑似・点字・誘導・手話体験の実施 90回	疑似・点字・誘導・手話体験の実施 約40回

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度 事業予定	平成29年度 進捗状況(10月1日時点)
				完了	事業中		
心のバリアフリー(理解、情報提供、手助け、利用)を妨げない、	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			1回	11月～12月頃発行予定
	生活関連施設等の各ホームページにおけるバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			10施設(累計26施設)	情報発信に向け調整中
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			バリアフリーマップ素案の作成	素案作成に向け調整中
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			1回 平成29年5月開催予定の商店会長会議において配布予定	1回 平成29年5月開催の商店会長会議において配布済み
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 商店会長会議(5/25開催予定)で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。	1回 商店会長会議(5/25開催)で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけました。
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回	10月中旬、1月中旬、3月中旬に開催予定あり
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【短期】			設置1箇所、修繕15箇所(7月完了予定) また、平成30年度以降に総合公園及び平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画している公共サインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ検討します。	設置1箇所、修繕15箇所(7月完了) また、平成30年度以降に総合公園及び平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画している公共サインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ検討します。
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【短期】				
