

## 平成29年度事業実績及び平成30年度事業予定

## 公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度	平成30年度
				完了	事業中	事業予定⇒【実績】(3月末時点)	事業予定
鉄道事業	①定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】		●	昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回) ⇒【12回(月1回)実施】	昇降設備(エレベーター・エスカレーター)法令点検 12回(月1回)
	②バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】		●	・平塚駅サービス勉強会 12回 ⇒【12回実施】	平塚駅サービス勉強会 12回
	③サービス介助士の資格取得の推進	毎年	【継続】		●	平塚駅社員資格受験 ⇒【4名取得】	平塚駅社員資格受験
バス事業	①ノンステップバスの導入	71両 (81両)	【長期】		●	24両(累計65両) ⇒【24両(累計65両)】	12両(累計77両)
	②利用環境の向上	年1箇所	【長期】		●	実施に向けて検討中 ⇒【農協神田支所前バス停にベンチを設置】 ※本厚木駅向きに1基(H29.10)	実施に向けて検討中
	③④社員教育の実施	年1回以上	【継続】		●	1回以上(月次教育で実施) ⇒【1回】	1回
タクシー事業	①UDタクシーの導入	21台	【長期】		●	神奈中ハイヤー(株) 2台(日産) ⇒【2台】 2台(福祉タクシー) ⇒【0台】 0台(トヨタ) ⇒【1台】 相模中央交通(株) 1台(日産) ⇒【0台】 5台(トヨタ) ⇒【1台】 神田交通(株) 0台(トヨタ) ⇒【1台】	平塚市内事業者(8社:旭交通(株)・追分交通(株)・神奈中ハイヤー(株)・神田交通(株)・江南交通(株)・相模中央交通(株)・平塚交通(株)・富士見交通(株、順不同) 8台(トヨタ) 江南交通(株) 1台(日産)
	②情報の共有、各社の連携	随時	【継続】		●	12回 ⇒【12回】	12回
	②乗務員教育の実施	年1回	【継続】		●	12回 ⇒【12回】	12回

## 道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度 事業予定⇒【実績】(3月末時点)	平成30年度 事業予定
				完了	事業中		
1 国道1号	①交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】		●	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現況でのEVの設置検討</li> <li>・現況での斜路付き階段の設置検討</li> <li>・平面横断経路の検討</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・現況でのEVの設置検討</li> <li>・現況での斜路付き階段の設置検討</li> <li>・平面横断経路の検討</li> </ul>
3 県道606号 (大島明石)	①歩道の段差改善	550m	【短期】	●		H28完了	
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	①視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】	●		H28完了	
6 駅前大通り線 (幹道31号)	①巻き込み部改修(セーティングつきでない)	4箇所	【長期】			—	4箇所(累計4箇所)
	②側溝の床板化	10m	【中期】	●		⇒【10m(累計10m)】	H29完了
	③視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【中期】		●	—	10m(累計10m)
7 駅前通り線 (幹道47号)	①巻き込み部改修(セーティングつきでない)	15箇所	【長期】		●	—	—
	②側溝の床板化	165m	【長期】			—	—
8 南町通東浅間線 (幹道34号)	①巻き込み部改修(セーティングつきでない)	44箇所	【短期】	●		H28完了	
	②歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【長期】			歩道切り下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	—

8 南町通東浅間線（幹道34号）	②歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	5箇所	【長期】			歩道切り下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	—
	③視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】	●		H28完了	
9 海岸南中線（幹道43号）	①巻き込み部改修（セーティンぐつきでない）	2箇所	【中期】	●		2箇所（累計2箇所） ⇒【2箇所（累計2箇所）】	H29完了
	②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【中期】	●		315m（累計315m） ⇒【315m（累計315m）】	H29完了
	③歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【中期】	●		10m（累計10m） ⇒【10m（累計10m）】	H29完了
10 宝町通り線（幹道30号）	①巻き込み部改修（セーティンぐつきでない）	29箇所	【短期】	●			
	②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	900m	【短期】	●			
11 南町通り線（幹道32号）	①巻き込み部改修（セーティンぐつきでない）	2箇所	【中期】	●		2箇所（累計2箇所） ⇒【2箇所（累計2箇所）】	H29完了
	②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【中期】	●		380m（累計380m） ⇒【380m（累計380m）】	H29完了
12 東海道本通り線（幹道29号）	①巻き込み部改修（セーティンぐつきでない）	18箇所	【長期】		●	2箇所（累計2箇所） ⇒【2箇所（累計2箇所）】	16箇所（累計18箇所）
13 後谷八幡裏線（幹道28号）	①巻き込み部改修（セーティンぐつきでない）	1箇所	【短期】	●		1箇所（累計1箇所） ⇒【1箇所（累計1箇所）】	H29完了

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	②歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】	●		2箇所（累計2箇所） ⇒【2箇所（累計2箇所）】	H29完了
	③視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】	●			
	④歩道舗装打ち換え	200m	【長期】			—	—
14 浅間町南原線（幹道20号）	①巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	10箇所	【長期】			—	—
	②歩道切り下げ改修（8%超え）	0箇所	【中期】	●		歩道切下げ改修については、民地側平坦部は基準を満たしており、支障がない。	
15 浅間町3号線	①歩道切り下げ改修（8%超え）	0箇所	【中期】			歩道切下げ改修については、民地側平坦部は基準を満たしており、支障がない。	—
	②巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	2箇所	【長期】			—	2箇所（累計2箇所）
	①歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】			歩道切下げ改修については、地形条件上、改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	—
16 平塚駅花水線（幹道35号）	①巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	7箇所	【短期】	●		7箇所（累計7箇所） ⇒【7箇所（累計7箇所）】	H29完了
	②歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】	●		1箇所（累計1箇所） ⇒【1箇所（累計1箇所）】	H29完了
	③視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】	●		340m（累計340m） ⇒【340m（累計340m）】	H29完了

17 八重咲町 袖ヶ浜線 (幹道21 号)	①巻き込み部改修（セーティングつきでない）	12箇所	【短期】	●	12箇所（累計12箇所） ⇒【12箇所（累計12箇所）】	H29完了
	②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】	●	315m（累計315m） ⇒【315m（累計315m）】	H29完了
18 須賀久領平 塚中学校線 (幹道38 号)	①視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】		—	—
19 三島神社後 谷線（幹道 36号）	①歩道切り下げ改修（8%超え）	0箇所	【中期】	●	歩道切下げ改修については、民地側平坦部は基準を満たしており、支障がない。	
	②視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】		630m（累計630m） ⇒【国の交付金を活用し、平成30年度整備予定】	305m（累計305m）
20 追分7号線	①巻き込み部改修（セーティングつきでない）	4箇所	【中期】		4箇所（累計4箇所） ⇒【国の交付金を活用し、平成30年度整備予定】	4箇所（累計4箇所）
	②歩道切り下げ改修（8%超え）	0箇所	【短期】	●	歩道切下げ改修については、民地側平坦部は基準を満たしており、支障がない。	
	②歩道切り下げ改修（乗り入れ部横断部2%超え）	4箇所	【長期】		歩道切下げ改修については、路線全体の地形条件上、改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。	—
	③歩道舗装打ち換え（植樹柵隆起のため）	600m	【長期】		—	—

## 都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度 事業予定⇒【実績】(3月末時点)	平成30年度 事業予定
				完了	事業中		
平塚市総合公園	①総合公園駐車場の改修事業	27,000㎡	【長期】		●	駐車場改修の方策を決定し、改修を実施する。 ⇒【駐車場改修の方策を決定した。】	平成30年9月末までに未舗装の舗装等の改修を実施する。
	①出入口の改善（上記改修事業に含む）	3箇所	【長期】		●	駐車場改修の方策を決定し、改修を実施する。 ⇒【駐車場改修の方策を決定した。】	平成30年9月末までに未舗装の舗装等の改修を実施する。
	①園路の改善（勾配）	1箇所	【中期】	●			
	①トイレの改善（出入口）	3箇所	【中期】		●	動きの重いトイレドアについて注油し、動きの悪いものは改修を行う ⇒【適宜必要な個所に注油し対応した。】	屋外トイレ改修のための設計委託を実施する。
湘南海岸公園	①湘南海岸公園再整備	8,700㎡	【長期】		●	園路の一部をバリアフリー化する予定 ⇒【完了（園路に段差解消のためにスロープを設置）】	出入口の改善を行います。

## 交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度 事業予定⇒【実績】(3月末時点)	平成30年度 事業予定
				完了	事業中		
交通安全特定事業	①交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】		●	点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。 ⇒【随時実施】	点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、設置可能箇所等については、その都度検討する。
	②違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】		●	2回（6月、10月）⇒【2回】 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施	2回 違法駐車パトロール隊と連携したパトロールを実施
	②交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】		●	・各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。 ⇒【随時実施】 ・交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。 ⇒【交通安全教室・講話 128回実施】 ・各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、多発傾向にある自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。⇒【随時実施】 ・警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。⇒【随時実施】	・各季交通安全運動期間中におけるキャンペーンによる広報啓発活動の実施。 ・交通安全教室及び交通安全講話を開催し、交通マナー向上を図る。 ・各季交通安全運動期間中及び各月対策期間中における交差点での交通監視活動を実施する。また、自転車事故を防止するため、悪質危険な自転車利用者に対する指導、取締りを推進する。 ・警察署ホームページに様々な交通情報をアップして、交通事故防止の呼びかけを実施する。

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度	平成30年度
				完了	事業中	事業予定⇒【実績】(3月末時点)	事業予定
平塚駅の移動円滑化	①施設管理者との協議	年6回	【継続】		●	4回⇒【4回】	4回
	②北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】		●	1回⇒【1回】	1回
	②北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】		●	1回⇒【1回】	1回
	③案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】		●	1回⇒【1回】	1回
平塚駅駐輪場周辺	①自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】		●	—	—
	②自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】		●	7回⇒【7回】	7回
	③放置自転車の撤去	通年	【継続】		●	通年で実施⇒【通年で実施】	通年で実施
安歩全行者の策	①自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】	●		—	—
	②生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】		●	0.2km(海岸南中線)(累計1.5km) ⇒【0.4km(海岸南中線)(累計1.7km)】	—
心のバリアフリー(手助け)	①「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回	【継続】		●	2回⇒【2回】	2回
	②疑似・点字・誘導・手話体験の実施	年90回	【継続】		●	90回⇒【106回】	【提案】疑似・点字・誘導・手話体験の実施100回

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成29年度	平成30年度
				完了	事業中	事業予定⇒【実績】(3月末時点)	事業予定
心のバリアフリー（ 「理解 提供」 手助け、 利用を妨 げない」）	①心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】		●	1回⇒【1回】	1回
	②生活関連施設等のバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】		●	10施設（累計26施設） ⇒【20施設（累計36施設※）】 ※「ひらつかわくわくマップ」に各施設の位置及びバリアフリー情報等の掲載	各施設のバリアフリー情報の更新（適宜）
	③バリアフリーマップの作成	一式	【中期】		●	バリアフリーマップ素案の作成 ⇒【「ひらつかわくわくマップ」にバリアフリー情報のマップデータの掲載】	バリアフリーマップの作成・印刷
	④生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】		●	1回 平成29年5月開催予定の商店会長会議において配布予定⇒【1回】	1回 平成30年5月開催予定の商店会長会議において配布予定
	⑤活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】		●	1回 商店会長会議（5/25開催予定）で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。⇒【1回】	1回 商店会長会議（5月頃開催予定）で資料を配布し、各個店や商店街での取組みを働きかけます。⇒【1回】
	⑥ボランティア研修の実施	年3回	【継続】		●	3回⇒【4回】	3回
公共サイン	①駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【中期】		●	設置1箇所、修繕15箇所（7月完了予定） また、平成30年度以降に総合公園及び平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画している公共サインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ検討します。 ⇒【修繕工事は完了・次年度設置場所検討】	平塚駅から総合公園周辺に案内サインを1箇所、誘導サインを4箇所程度整備します。また、平成31年度以降に平塚駅南口周辺に、新たに設置を計画しているサインの設置場所や表示内容等について、庁内関係課と意見交換も踏まえ検討します。
	①駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【中期】	●			




路線名	駅前大通り線（幹道31号）	事業者	平塚市
事業区間	平塚駅北口駅前広場 ～ 宮の前交差点	区間延長	405m
事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。 ②側溝蓋等は、杖等が落ち込まない構造に改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	4箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
②側溝の床板化	10m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	10				
③視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足）	10m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				

事業実施に際し配慮すべき事項

滑面タイルの歩道整備につきましては、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

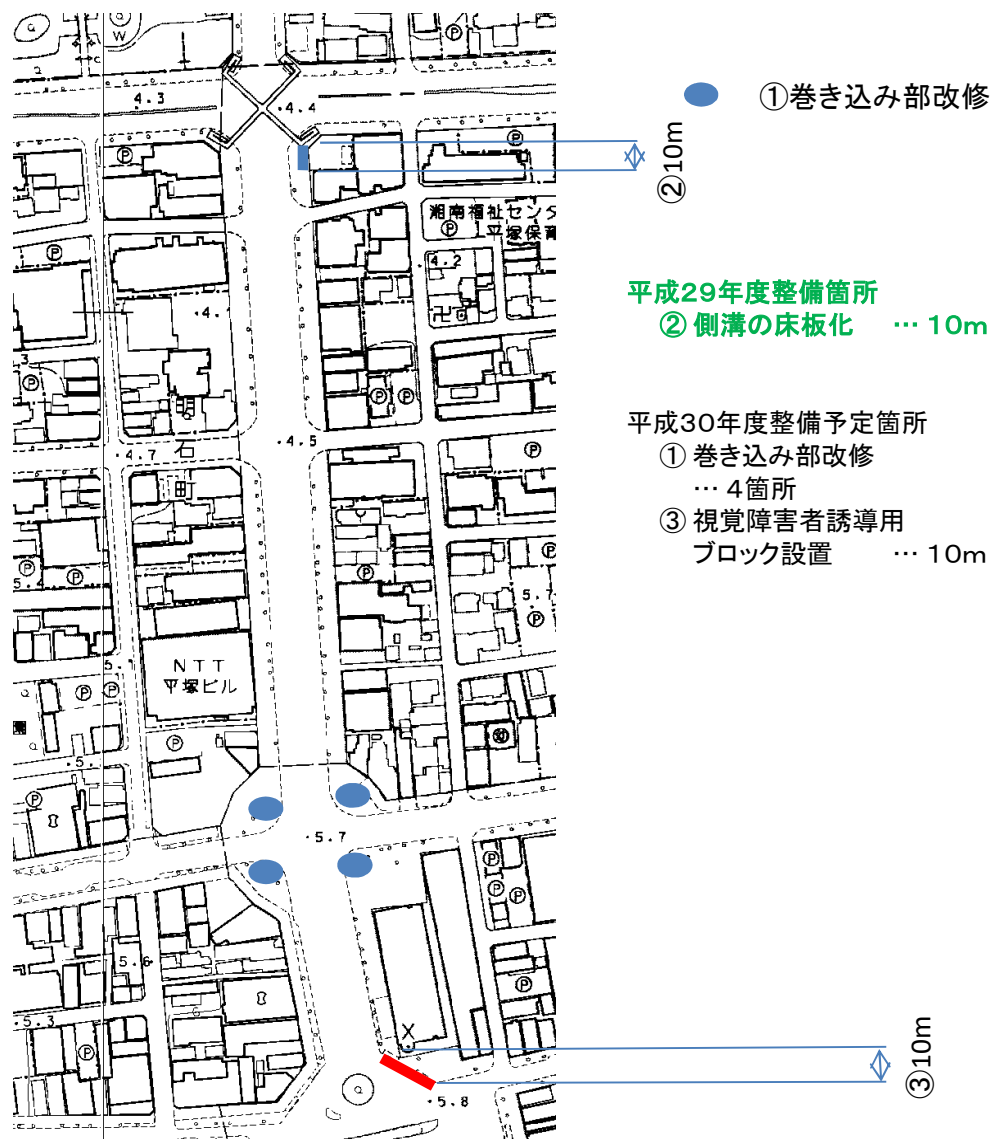


道路特定事業

路線名	海岸南中線（幹道43号）	事業者	平塚市						
事業区間	市民プラザ前交差点 ～ 平塚駅花水線	区間延長	216m						
事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。 ②視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。								
事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	2箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	2				完了
②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	315				完了
③歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	10				完了

事業実施に際し配慮すべき事項

事業詳細

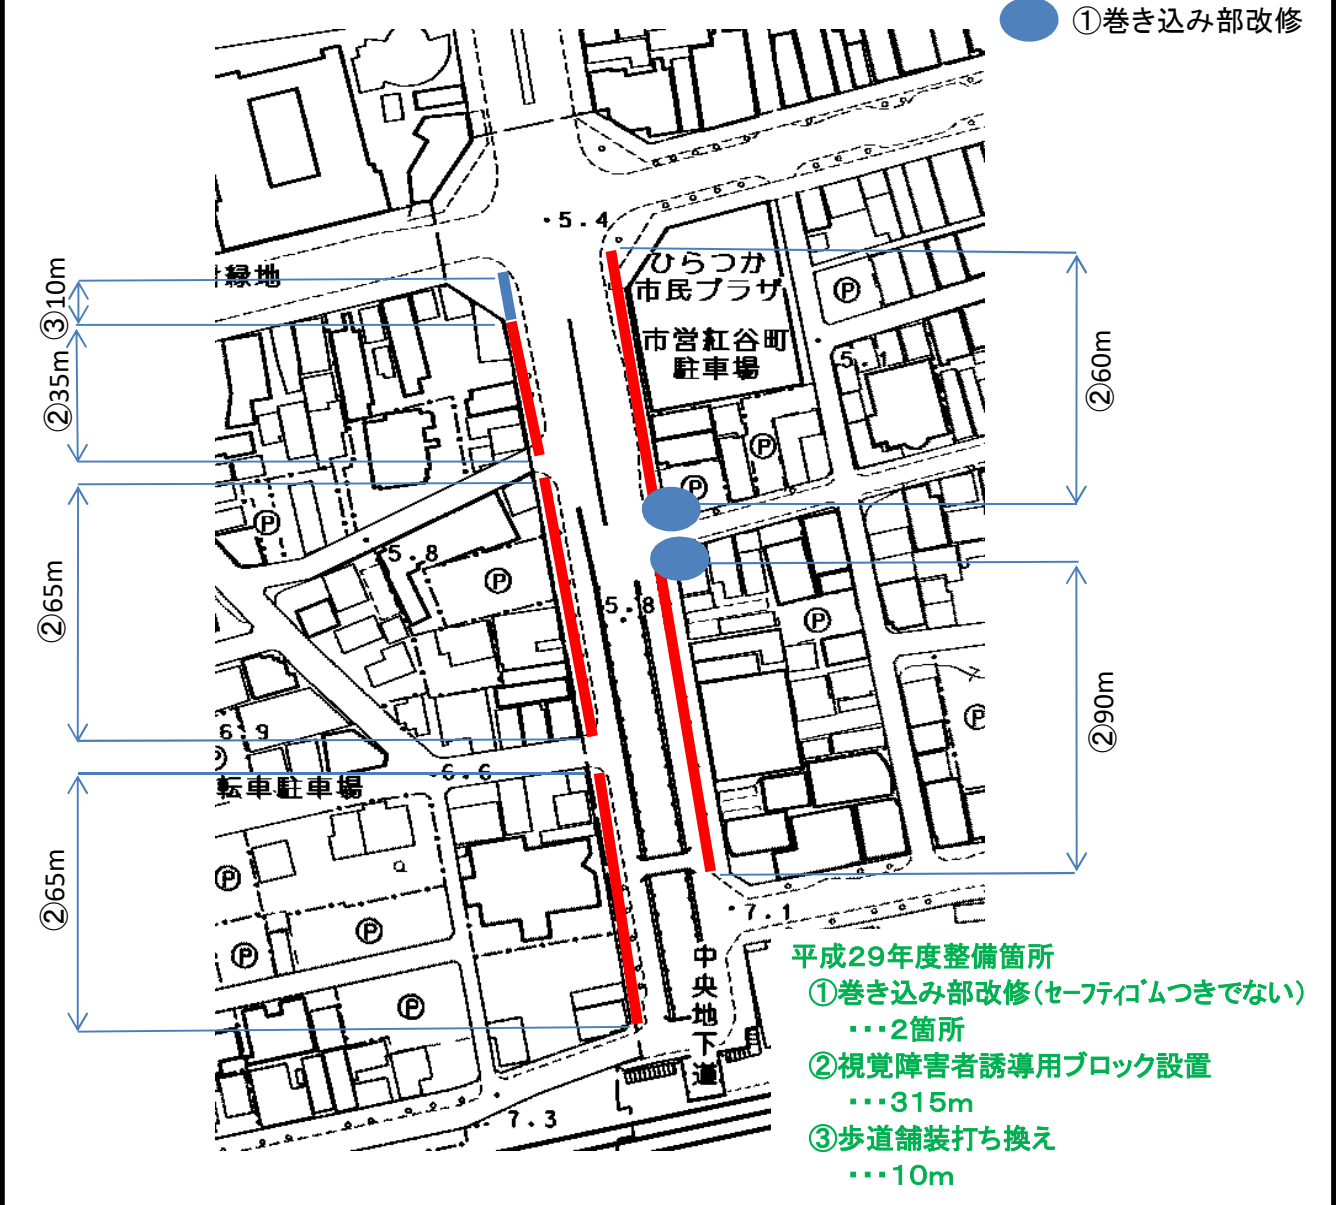

路線名	南町通り線（幹道32号）	事業者	平塚市
事業区間	平塚駅北口駅前広場 ～ 南町通東浅間線	区間延長	215m


事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。 ②視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。
------	---

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	2箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	2				完了
②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	380				完了
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。滑面タイルの改修及びセーフティブロックの設置は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

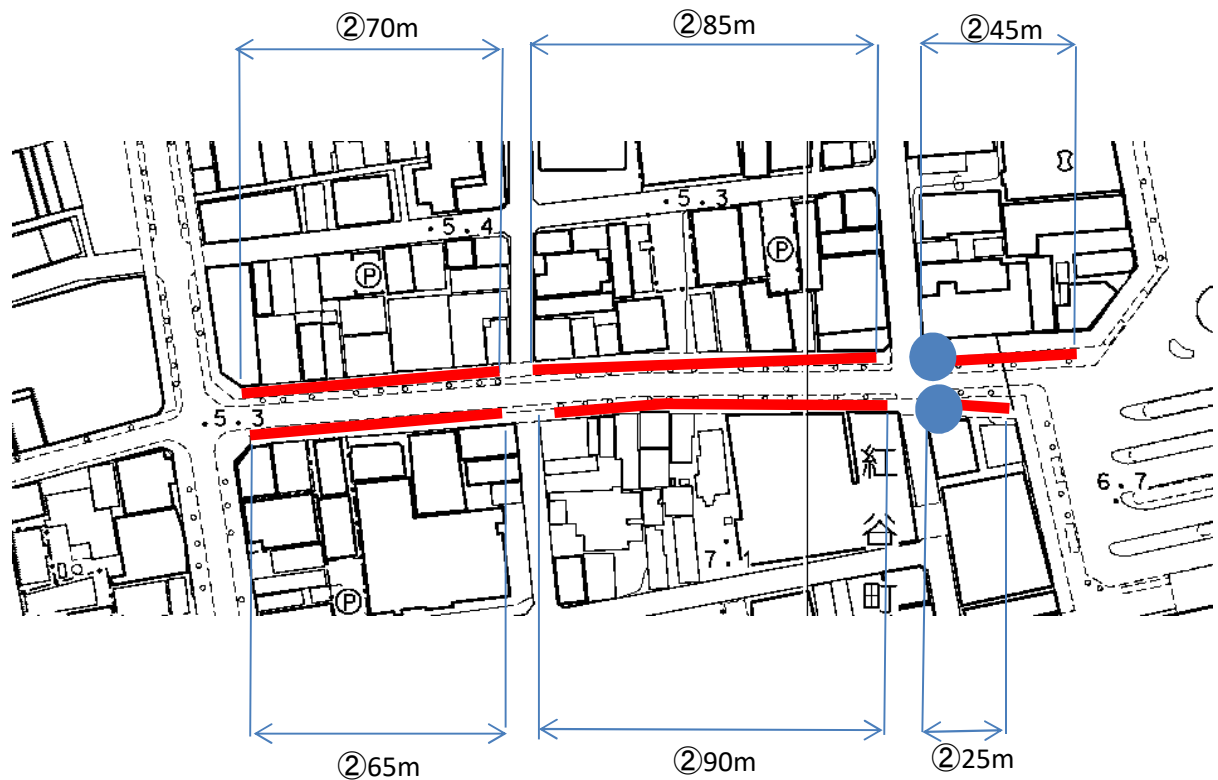

● ①巻き込み部改修

平成29年度整備箇所

- ①巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）  
… 2箇所
- ②視覚障害者誘導用ブロック設置  
… 380m

路線名	東海道本通り線（幹道29号）	事業者	平塚市
事業区間	MNプラザ ～ 市民センター	区間延長	680m

事業内容 ①交差点巻き込み部の段差を改善します。

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	18箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	2				
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

滑面タイルの改修につきましては、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細



①H29 N=2箇所

平成29年度整備箇所

①巻き込み部改修 … 2箇所

● ①巻き込み部改修

平成30年度整備予定箇所

①巻き込み部改修 … 16箇所


路線名	後谷八幡裏線（幹道28号）	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ～ 平塚市役所前交差点	区間延長	347m
事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。 ②切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	1				完了
②歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	2				完了
③視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		180							完了
④歩道舗装打ち換え（滑面平板）	200m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

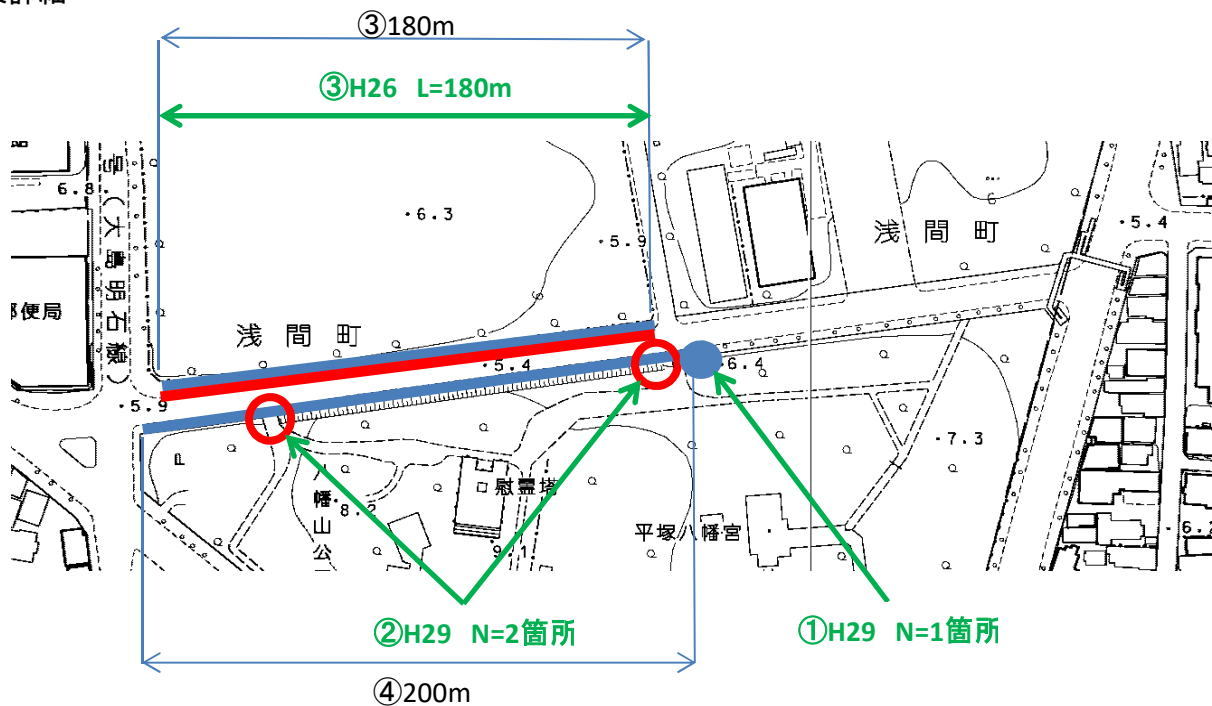

- ①巻き込み部改修
- ②歩道切り下げ改修

平成29年度整備箇所

- ① 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）  
… 1箇所
- ② 歩道切り下げ改修  
… 2箇所

路線名	浅間町3号線	事業者	平塚市
事業区間	平塚警察署入口交差点 ～ 県合同庁舎前交差点	区間延長	445m
事業内容	①切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①歩道切り下げ改修（8%超え）	0箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
②巻き込み部改修（セフィグムつきでない）	2箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
①横断歩道の歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

①歩道切り下げ改修(8%超え)箇所については、民地側平坦部は基準を満たしており、通行に支障がないため削除

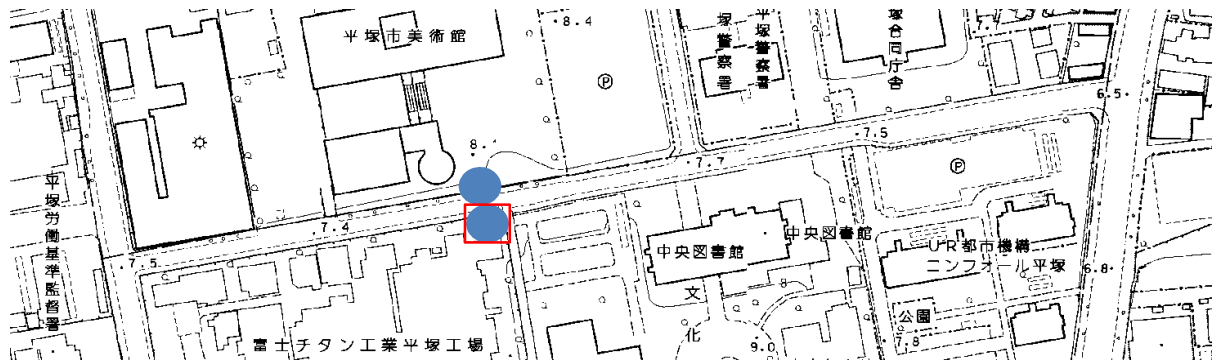

平成30年度整備予定箇所  
② 巻き込み部改修 … 2箇所

- ②巻き込み部改修
- ①横断歩道の歩道切り下げ改修




路線名	平塚駅花水線（幹道35号）	事業者	平塚市
事業区間	海岸南中線 ～ 南町通東浅間線	区間延長	195m
事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。 ②切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 ③視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	7箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	7				完了
②歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	1				完了
③視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	340				完了

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

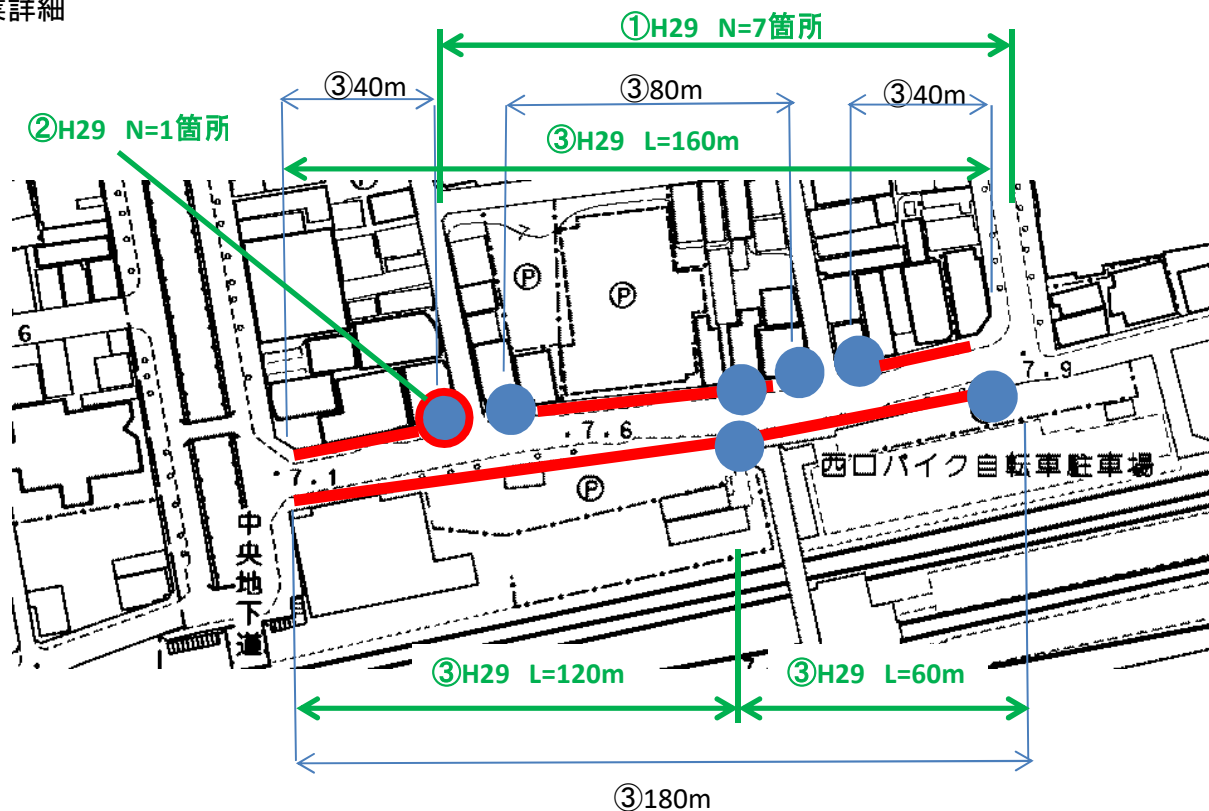

- ①巻き込み部改修
- ②歩道切り下げ改修

- 平成29年度整備箇所
- ① 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）  
… 7箇所
  - ② 歩道切り下げ改修  
… 1箇所
  - ③ 視覚障害者誘導用ブロック設置  
… 340m


路線名	八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	事業者	平塚市
事業区間	平塚駅南口駅前広場 ～ 須賀打越羽衣町線	区間延長	191m
事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。 ②視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）	12箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	12				完了
②視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	315				完了
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

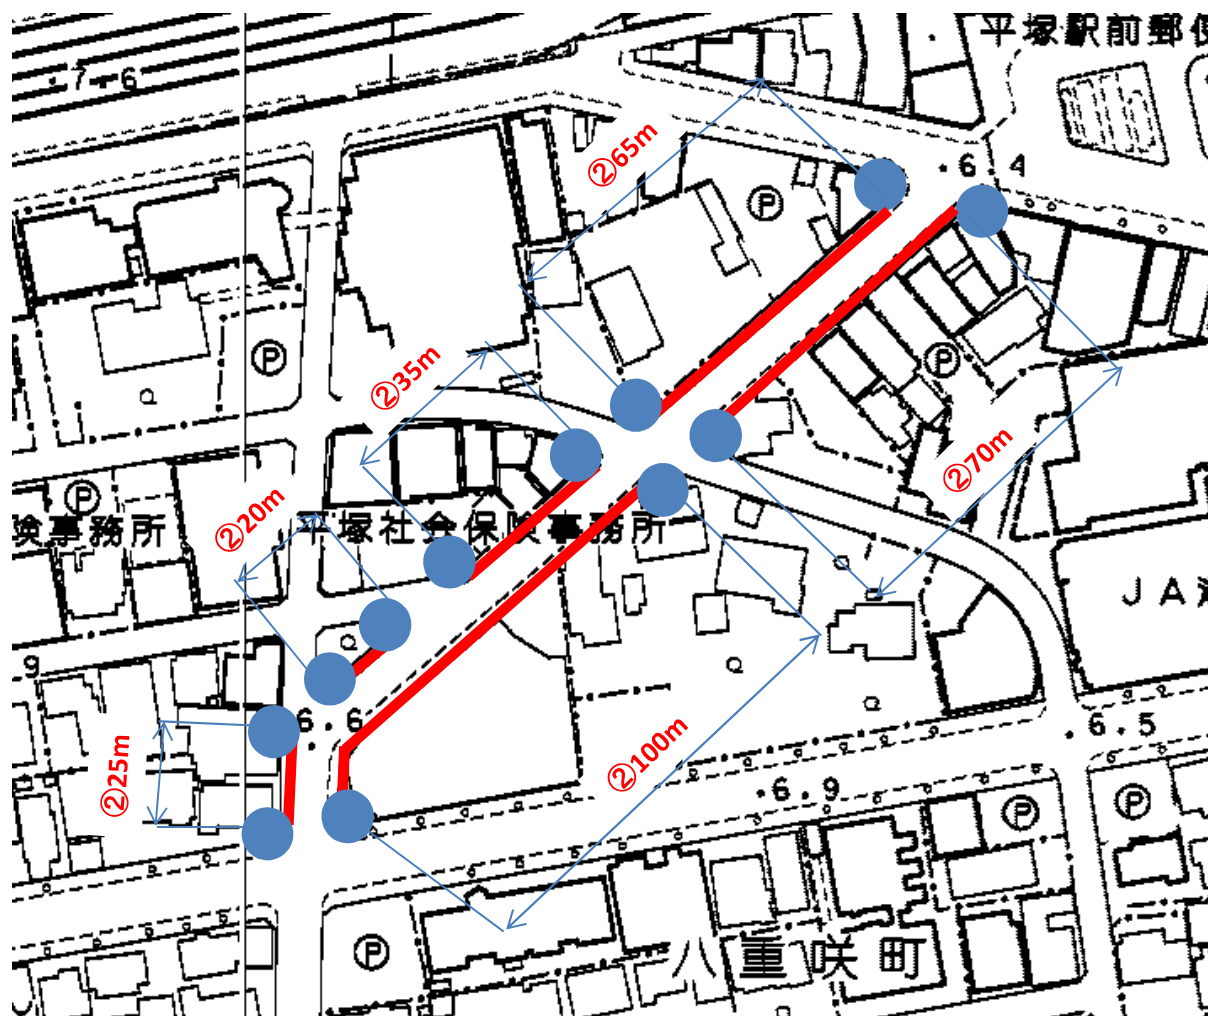

①巻き込み部改修

平成29年度整備箇所

- ① 巻き込み部改修（セーフティゴムつきでない）  
… 12箇所
- ② 視覚障害者誘導用ブロック設置  
… 315m



路線名	三島神社後谷線（幹道36号）	事業者	平塚市
事業区間	須馬踏切 ～ モータースクール前交差点	区間延長	433m
事業内容	①切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。 ②視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①歩道切り下げ改修（8%超え）	0箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
②視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。

事業詳細

平成30年度整備予定箇所  
 ② 視覚障害者誘導用ブロック設置  
 … 305m

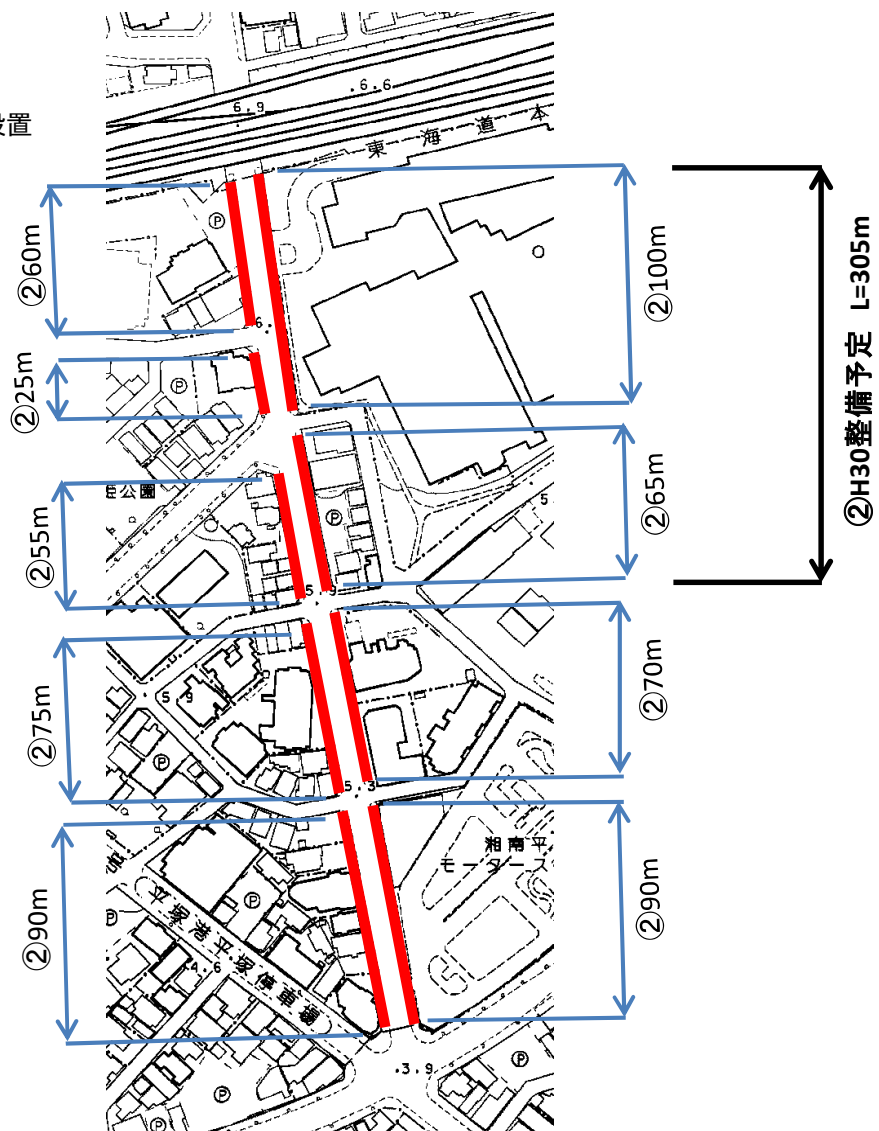

①歩道切り下げ改修(8%超え)箇所については、民地側平坦部は基準を満たしており、通行に支障がないため削除


路線名	追分7号線	事業者	平塚市
事業区間	平塚ろう学校前交差点 ～ 大原交差点	区間延長	816m
事業内容	①交差点巻き込み部の段差を改善します。 ②切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
①巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	4箇所	【中期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
②歩道切り下げ改修（8%超え）	0箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
②歩道切り下げ改修（乗り入れ部横断部2%超え）	4箇所	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				
③歩道舗装打ち換え（植樹柵隆起のため）	600m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-				

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

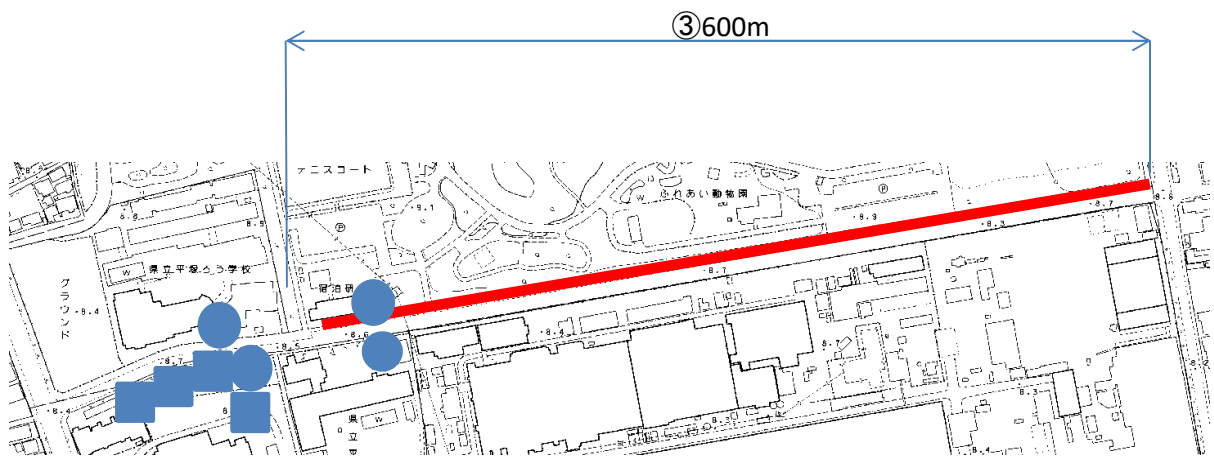

● ①巻き込み部改修

■ ②歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)

②歩道切り下げ改修(8%超え)の箇所については、民地側平坦部は基準を満たしており、通行に支障がないため削除

平成30年度整備予定箇所

① 巻き込み部改修 … 4箇所
