

令和2年度事業実績及び令和3年度事業予定

公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度	令和3年度
				完了	事業中	事業予定 【実績】 (3月末時点)	事業予定
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備（エレベーター・エスカレーター）法令点検 12回（月1回） 【12回実施済（4月から3月の月1回）】	昇降設備（エレベーター・エスカレーター）法令点検 12回（月1回）
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			平塚駅サービス勉強会 12回 【12回実施済（4月から3月の月1回）】	平塚駅サービス勉強会 12回（月1回）
	サービス介助士の資格取得の推進	毎年	【継続】			平塚駅社員資格受験 【8名取得済（上半期4名、下半期4名）】	平塚駅社員のサービス介助士資格取得の推進
バス事業	ノンステップバスの導入	71両 (81両)	【長期】			4両（累計87両）（下期導入予定） 【導入なし（累計83両）】 新型コロナウイルス感染症拡大による影響を考慮して、下期4両導入予定から変更。	導入予定なし（累計83両） 新型コロナウイルス感染症拡大による影響を考慮して、令和4年度以降の導入を検討。
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			実施に向けて検討中 【0箇所】	実施に向けて検討中
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回以上（月次教育で実施（座学）） また、高齢者疑似体験、車いす利用のお客様への対応に関する体験教育を実施予定。 【12回実施（毎月1回実施（座学））】 また、2021年3月に高齢者疑似体験、車いす利用のお客様への対応に関する体験教育を実施。	1回以上（月次教育で実施（座学）） また、高齢者疑似体験、車いす利用のお客様への対応に関する体験教育を実施予定。
タクシー事業	UDタクシーの導入	21台	【長期】			平塚市内事業者（8社：旭交通(株)・追分交通(株)・神奈中ハイヤー(株)・神田交通(株)・江南交通(株)・相模中央交通(株)1台・平塚交通(株)・富士見交通(株)、順不同）8台（トヨタ） 【2台（累計21台）】 神奈中タクシー1台（日産セレナ） 神田交通1台（トヨタジャパントクシー）	平塚市内事業者7社（7社：旭交通(株)・追分交通(株)・神奈中タクシー(株)・神田交通(株)・江南交通(株)）各社1台
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			12回 【12回】	情報共有、各社の連携を目的とした平塚地区会の会議 年12回
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			12回 【12回】	月一回の法令の乗務員教育 年12回

道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定 【実績】(3月末時点)	令和3年度 事業予定
				完了	事業中		
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】				
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】				
6 駅前大通り線 (幹道31号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	4箇所	【長期】				
	側溝の床板化	10m	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【中期】				
7 駅前通り線 (幹道47号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	15箇所	【長期】				
	側溝の床板化	165m	【長期】				
8 南町通東浅間線(幹道34号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	44箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【長期】			-	歩道切り下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、歩道部のみでの改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。

8 南町通東浅間線(幹道34号)	歩道切り下げ改修(横断部2%超え)	5箇所	【長期】				歩道切下げ改修については、民地との高低差が大きく、路線全体の地形条件上、歩道部のみでの改修が困難であるため、対応可能な整備方法を関係団体と調整していく。
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	550m	【短期】				
9 海岸南中線(幹道43号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	2箇所	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、ブロック無)	315m	【中期】				
	歩道舗装打ち換え(凹凸)	10m	【中期】				
10 宝町通り線(幹道30号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	29箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	900m	【短期】				
11 南町通り線(幹道32号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	2箇所	【中期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	380m	【中期】				
12 東海道本通り線(幹道29号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	18箇所	【長期】				
13 後谷八幡裏線(幹道28号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	1箇所	【短期】				

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】				
	歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	200m	【長期】			72m（累計200m）	【72m（累計200m）】
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	10箇所	【長期】				
15 浅間町3号線	巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	2箇所	【長期】				
	歩道切り下げ改修（横断部2%超え）	1箇所	【長期】				
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	7箇所	【短期】				
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】				
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	12箇所	【短期】				
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】				

18 須賀久領平塚中学校線 (幹道38号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】			440m (累計565m) 【440m (累計565m)】	
19 三島神社後谷線 (幹道36号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】				
20 追分7号線	巻き込み部改修 (セ-フイコ-ムつきでない)	4箇所	【中期】				
	歩道切り下げ改修 (乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【長期】				
	歩道舗装打ち換え (植樹柵隆起のため)	600m	【長期】				

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定 【実績】(3月末時点)	令和3年度 事業予定
				完了	事業中		
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000 m ²	【長期】				
	出入口の改善(上記改修事業に含む)	3箇所	【長期】				
	園路の改善(勾配)	1箇所	【中期】				
	トイレの改善(出入口)	3箇所	【中期】				
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	8,700m ²	【中期】				

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定 【実績】(3月末時点)	令和3年度 事業予定
				完了	事業中		
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			・交通安全施設(信号機、道路標識等)の点検を随時行い、緊急性、必要性の高い補修を行う。 【随時】	・交通安全施設(信号機、道路標識等)の点検を随時行い、緊急性、必要性の高い補修を行う。
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			・駐車監視員活動ガイドラインを中心とした違法駐車取締り ・駐車監視員による違法駐車取締り ・歩道等における放置バイクの排除 【随時】	・駐車監視員活動ガイドラインを中心とした違法駐車取締り ・駐車監視員による違法駐車取締り ・歩道等における放置バイクの排除
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			・各季の運動中におけるキャンペーンによる広報啓発活動 ・交通安全の日、各季の運動における交差点での交通監視やパトカーによる交通安全広報 ・小学校等における交通安全教室・講話 【随時】	・各季の運動中におけるキャンペーンによる広報啓発活動 ・交通安全の日、各季の運動における交差点での交通監視やパトカーによる交通安全広報 ・小学校等における交通安全教室・講話

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度 事業予定 【実績】(3月末時点)	令和3年度 事業予定
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			6回 【11回】	6回
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回 【1回】	1回
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回 【1回】	1回
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回 【1回】	1回
平塚駅駐輪対周策の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			「駅南側駐輪場再整備基本計画」に基づき駐輪場の改修を実施予定 【八重咲町公園第一駐輪場の改修を実施(収容台数422台 587台)】	「駅南側駐輪場再整備基本計画」に基づき駐輪場の改修に向けた事業調整
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			7回 【4回】	7回
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			通年で実施 【通年で実施】	通年で実施
安歩安全行者の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】				
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			- 生活関連経路以外の路線で実施	- 生活関連経路以外の路線で実施
心の解、手助け(理)	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回	【継続】			3回 【3回】 4月上旬の「発達障害啓発週間」、7月下旬の「ともに生きるかながわ推進週間」、12月上旬の「障害者週間」に実施したパネル展において啓発活動を行いました。	心のバリアフリー(理解、手助け、利用を妨げない、情報提供)と統合
	疑似・点字・誘導体験の実施	年90回	【継続】			【提案】車いす・疑似・点字・誘導・手話体験の実施 100回 【39回】 新型コロナウイルス感染症拡大防止のため体験依頼が減少したため	新型コロナウイルス感染症の状況を把握しつつ、依頼時に感染症の対策をして各種体験を実施する。年100回の予定 【提案】車いす・疑似・点字・誘導・手話・盲導犬・車いすバスケ・当事者の講話等

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		令和2年度	令和3年度
				完了	事業中	事業予定	事業予定
心のバリアフリー（理解、手助け、利用を妨げない、情報提供）	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			1回 【1回】 障害者差別解消における合理的配慮の好事例集リーフレットを作成しました。また、「心のバリアフリー」に関する冊子を作成し、市内各公共施設や各種イベント等で配布しました。	パネル展の開催 年3回 4月上旬の「発達障害啓発週間」、7月下旬の「ともに生きるかながわ推進週間」、12月上旬の「障害者週間」に実施したパネル展において啓発活動を行う予定。 福祉ショップ「ありがとう」を通じた取組み 通年 冊子等を活用した周知・啓発 通年 チラシを作成するとともに、市内各公共施設や障害サービス事業所等へ配架し、各種イベント等で配布予定。
	生活関連施設等のバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			1回 【1回】 各施設のバリアフリー情報の更新（適宜）	適宜更新
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			1回 【1回】 共生社会ホストタウン事業と連携したバリアフリーマップの作成・印刷	適宜更新
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			1回 【1回】 令和2年12月に商店会長宛てに啓発チラシを送付しました（商店会長会議で資料を配布予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）。	令和3年5月開催予定の商店会長会議において配布予定。
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			1回 【1回】 令和2年12月に商店会長宛てに啓発チラシを送付しました（商店会長会議で資料を配布予定だったが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止）。	1回 商店会長会議で資料を配布し、各個店や商店街での取組を働きかけます。
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回 【3回】 生活支援コーディネーターチーム構成員研修開催回数	3回 生活支援コーディネーターチーム構成員研修開催回数
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【中期】			平塚駅北口周辺への公共サインの設置については、当初計画分は令和元年度に整備完了。 <その他の取組> 見附台周辺地区の整備に伴い、地区周辺に誘導サインを3箇所設置していく予定。駅南口周辺への設置については、庁内関係課も含め、設置場所や表示内容等について検討。	<その他の取組> 平塚駅北口周辺においては、東海道本通り線北側歩道に誘導サインを2箇所設置予定。 駅南口周辺への設置については、庁内関係課も含め、設置場所や表示内容等について検討。
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【中期】				<その他の取組> 見附台周辺地区の整備に伴い、誘導サイン7基、地区案内サイン5基の表示内容を変更予定。また、平塚宿史跡絵地図についても表示内容の更新・修繕を実施予定。

道路特定事業


路線名	後谷八幡裏線（幹道28号）	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ~ 平塚市役所前交差点	区間延長	347m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セ・テ・ロムつきでない）	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	1				完了
歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	2				完了
視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		180							完了
歩道舗装打ち換え（滑面平板）	200m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-	-	128	72	完了

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

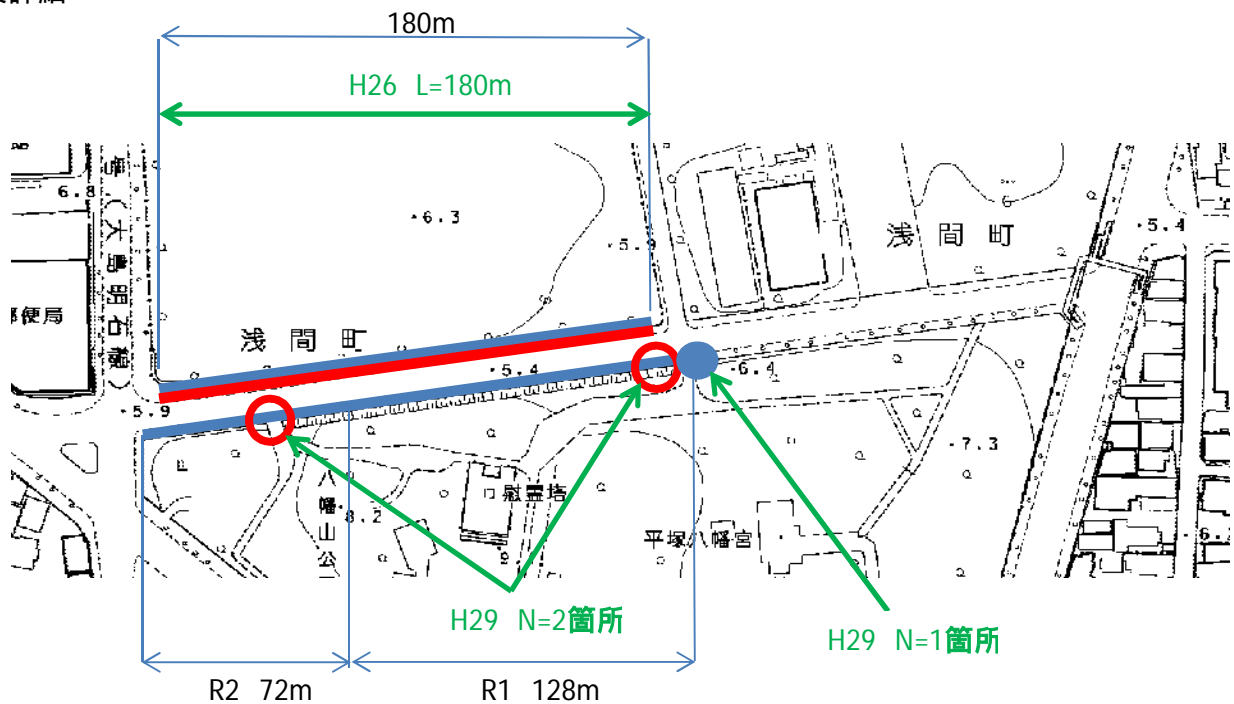

- 巻き込み部改修
- 歩道切り下げ改修

路線名	須賀久領平塚中学校線（幹道38号）	事業者	平塚市
事業区間	モータースクール前交差点 ~ 久領堤交差点	区間延長	337m
事業内容	視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		-	-	-	-	125	-	440	完了
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化につきましては、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

令和2年度整備箇所(道路整備課)
視覚障害者誘導用ブロック設置 ... 440m

