

平成26年度事業実績及び予定

公共交通特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成26年度 事業実績	平成27年度 事業予定
				完了	事業中		
鉄道事業	定期的なバリアフリー設備の点検	年12回	【継続】			昇降設備（エレベーター・エスカレーター） 法令点検 12回（月1回）	12回（月1回）
	バリアフリーやサービスについての勉強会等	年12回	【継続】			・平塚駅サービス勉強会 12回 ・平塚駅北口バリアフリールート3者協議 （平塚市・JR東日本・湘南ステーションビル）1回 H27/01/26より開始	・12回 ・6回
	サービス介助士の資格取得の推進	年3人	【継続】			平塚駅社員資格取得 7人	3人以上
バス事業	ノンステップバスの導入	81両	【長期】			11両（累計11両） （参考）ノンステップバス導入率 $42/162 = 26\%$ （平成27年3月31日時点）	12両（累計23両）
	利用環境の向上	年1箇所	【長期】			1箇所 南金目バス停（平塚信用金庫 金目支店前） ベンチの設置	1箇所
	社員教育の実施	年1回以上	【継続】			1回	1回
タクシー事業	UDタクシーの導入	年1台	【長期】			-	-
	情報の共有、各社の連携	随時	【継続】			随時	随時
	乗務員教育の実施	年1回	【継続】			1回	1回以上

道路特定事業

経路番号 路線名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成26年度 事業実績	平成27年度 事業予定
				完了	事業中		
1 国道1号	交差点部のバリアフリー化	1式	【長期】			<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討 	<ul style="list-style-type: none"> ・現況でのEVの設置検討 ・現況での斜路付き階段の設置検討 ・平面横断経路の検討
3 県道606号 (大島明石)	歩道の段差改善	550m	【短期】			90m (累計90m)	30m + 60m = 90m (累計180m)
5 県道608号 (平塚停車場袖ヶ浜)	視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】			210m (累計210m)	80m (累計290m)
6 駅前大通り線 (幹道31号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	11箇所	【長期】			-	-
	側溝の床板化	10m	【長期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足)	10m	【長期】			-	-
7 駅前通り線 (幹道47号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	15箇所	【中期】			-	-
	側溝の床板化	165m	【中期】			-	-
8 南町通東浅間線 (幹道34号)	巻き込み部改修(セーフティムつきでない)	44箇所	【短期】			-	44箇所 (累計44箇所)
	歩道切り下げ改修(8%超え)	32箇所	【短期】			-	32箇所 (累計32箇所)

8 南町通東浅間線（幹道34号）	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】			-	550m（累計550m）
9 海岸南中線（幹道43号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	4箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	315m	【短期】			-	-
	歩道舗装打ち換え（凹凸）	10m	【短期】			-	-
10 宝町通り線（幹道30号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	29箇所	【短期】			-	29箇所（累計29箇所）
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	900m	【短期】			-	900m（累計900m）
11 南町通り線（幹道32号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	7箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【短期】			-	-
12 東海道本通り線（幹道29号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	26箇所	【中期】			-	-
13 後谷八幡裏線（幹道28号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	1箇所	【短期】			-	-
	歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】			-	-

13 後谷八幡裏線（幹道28号）	視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】			180m（累計180m）	-
	歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	380m	【長期】			-	-
14 浅間町南原線（幹道20号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	7箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、点字無）	380m	【短期】			-	-
15 浅間町3号線	歩道切り下げ改修（8%超え）	7箇所	【中期】			-	-
	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	2箇所	【中期】			-	-
16 平塚駅花水線（幹道35号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	10箇所	【短期】			-	-
	歩道切り下げ改修（8%超え）	1箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック設置	340m	【短期】			-	-
17 八重咲町袖ヶ浜線（幹道21号）	巻き込み部改修（セーフィングつきでない）	12箇所	【短期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、ブロック無）	315m	【短期】			-	-

18 須賀久領平塚中学校線 (幹道38号)	視覚障害者誘導用ブロック設置	565m	【中期】			-	-
19 三島神社後谷線(幹道36号)	歩道切り下げ改修(8%超え)	2箇所	【中期】			-	-
	視覚障害者誘導用ブロック設置	630m	【中期】			-	-
20 道分7号線	巻き込み部改修(セーフィングつきでない)	4箇所	【短期】			-	-
	歩道切り下げ改修(8%超え)	8箇所	【短期】			-	-
	歩道切り下げ改修(乗り入れ部横断部2%超え)	4箇所	【中期】			-	-
	歩道舗装打ち換え(植樹樹隆起のため)	600m	【長期】			-	-

都市公園特定事業

公園名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成26年度 事業実績	平成27年度 事業予定
				完了	事業中		
平塚市総合公園	総合公園駐車場の改修事業	27,000 m ²	【短期】			実施設計	-
	出入口の改善（上記改修事業に含む）	3箇所	【短期】			実施設計	-
	園路の改善（勾配）	20m	【中期】			-	-
	トイレの改善（出入口）	3箇所	【中期】			-	-
湘南海岸公園	湘南海岸公園再整備	2.4ha 8,700m ²	【中期】			再整備基本設計委託	再整備実施設計委託

交通安全特定事業

事業名	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成26年度 事業実績	平成27年度 事業予定
				完了	事業中		
交通安全特定事業	交通安全施設の点検・補修	随時	【継続】			付加装置付信号機 点検29箇所 横断歩道・一時停止等の補修 上申22箇所	点検を随時確実に行うとともに、生活関連経路を点検し、必要かつ設置可能箇所については、その都度検討する。
	違法駐車追放強化期間の実施	年2回	【継続】			2回（6月、10月 各1カ月間）	2回 強化期間に合わせ、違法駐車パトロール隊によるパトロールを実施
	交通マナー向上のための広報、啓発活動の実施	随時	【継続】			・駐車監視員活動ガイドラインマップの作成 ・各季の交通安全運動期間中にキャンペーンを実施 ・交通安全教室、交通安全講話等を155回開催実施	・キャンペーンの実施、悪質な自転車利用者等に対しては指導・取締りを強化する。 ・交通安全教室等を開催し、歩行者の安全を確保する。 ・主要交差点等に警察官を配置し、交通監視を実施する。悪質危険な歩行者妨害違反の指導取締りを推進していく。

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成26年度 事業実績	平成27年度 事業予定
				完了	事業中		
平塚駅の移動円滑化	施設管理者との協議	年6回	【継続】			3回	6回
	北口と南口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	1回
	北口と西口を結ぶ歩行空間の確保についての協議	年1回	【継続】			1回	1回
	案内情報施設の設置についての協議	年1回	【継続】			1回	1回
平塚駅駐輪場対周策の	自転車等駐輪場の整備	一式	【継続】			八重咲町第2駐輪場の整備（平成27年4月1日供用開始）収容台数 105台 全体収容台数10,278台	-
	自転車利用マナーアップキャンペーンの実施	年7回	【継続】			14回	7回
	放置自転車の撤去	通年	【継続】			平成26年度 放置台数調査結果 296台 平成26年度 年間撤去実績 3,349台	通年での実施
安歩全行者策の	自転車利用環境推進計画の策定	一式	【短期】			平成27年3月 計画策定	-
	生活関連経路における自転車走行環境整備	10.3km	【継続】			1km（累計1km イチョウ並木通り、紅谷町地内）	1km（累計2km 平塚駅花水線）
フリーハンド（心のバリアフリー）	「障害者週間」キャンペーン事業の実施等	年1回以上	【継続】			1回	2回
	疑似・点字・誘導体験の実施	年45回	【継続】			45回	45回

その他の事業

項目	事業計画	事業量	事業期間	取組状況		平成26年度 事業実績	平成27年度 事業予定
				完了	事業中		
心のバリアフリー（ 理解、手助け、 情報提供） を妨げない（ 利用	心のバリアフリーについてのチラシの発行	年1回	【継続】			-	1回
	生活関連施設等の各ホームページにおけるバリアフリー情報の発信	37施設	【中期】			-	10施設
	バリアフリーマップの作成	一式	【中期】			-	骨格の検討、各施設等への周知
	生活関連経路の巡回指導、啓発パンフレットの配布	年1回	【継続】			-	1回 平成27年5月25日（月）開催予定の商店会長会議において配布予定
	活動事例の紹介及び取組依頼	年1回	【継続】			-	1回 平成27年5月25日（月）開催予定の商店会長会議において依頼予定
	ボランティア研修の実施	年3回	【継続】			3回	3回
公共サイン	駅周辺公共施設等案内サインの設置	10箇所	【短期】			-	-（設置位置及び表示内容の調整,サイン設置による効果測定）
	駅周辺公共施設等案内サインの修繕	15箇所	【短期】			-	-


道路特定事業

路線名	県道606号(大島明石)	事業者	神奈川県
事業区間	八幡宮前～平塚市総合公園	区間延長	1460m
事業内容	歩道の段差を改善します。(大原交差点～平塚市総合公園)		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
歩道の段差改善	550m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		90m							
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

事業詳細

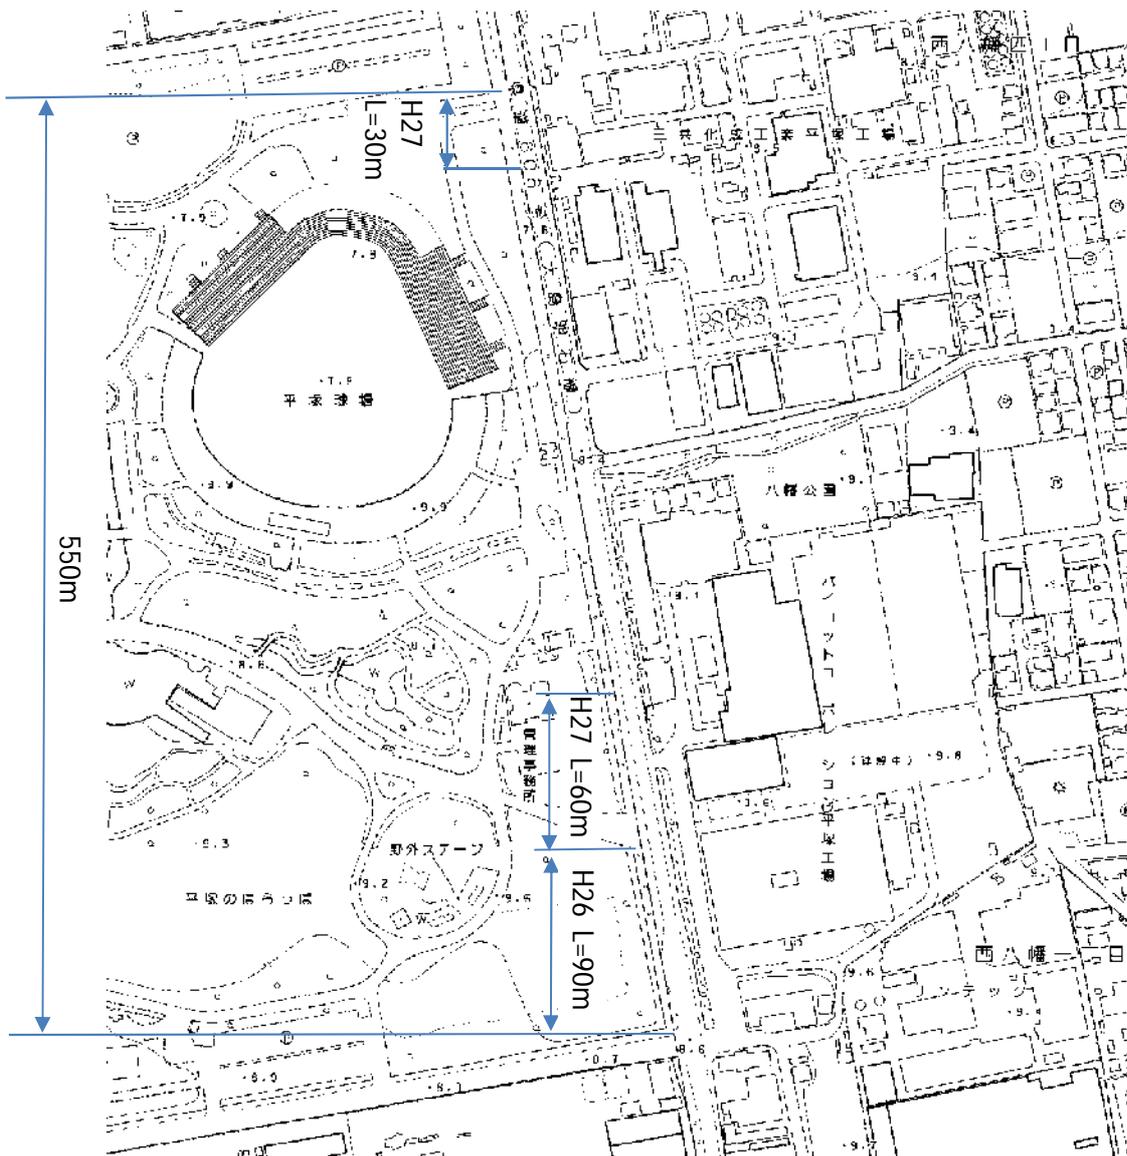

道路特定事業

路線名	県道608号(平塚停車場袖ヶ浜)	事業者	神奈川県
事業区間	平塚駅南口~平塚駅南口入口交差点	区間延長	1220m
事業内容	視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。 (ふれあい平塚ホスピタル~平塚駅南口入口交差点)		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
視覚障害者誘導用ブロック設置	530m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

事業詳細



路線名	南町通東浅間線（幹道34号）	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ~ 平塚駅花水線	区間延長	713m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		


事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セーフティムつきでない）	44箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
歩道切り下げ改修（8%超え）	32箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
視覚障害者誘導用ブロック改修（輝度不足、配置不良、ブロック無）	550m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部の改修で対応します。滑面タイルの改修は、路線の全体事業に合わせて事業を進めていく予定です。

事業詳細

- 平成27年度整備予定箇所
- 巻き込み部改修
... 44箇所
- 歩道切り下げ改修
... 32箇所
- 視覚障害者誘導用ブロック改修
... 550m

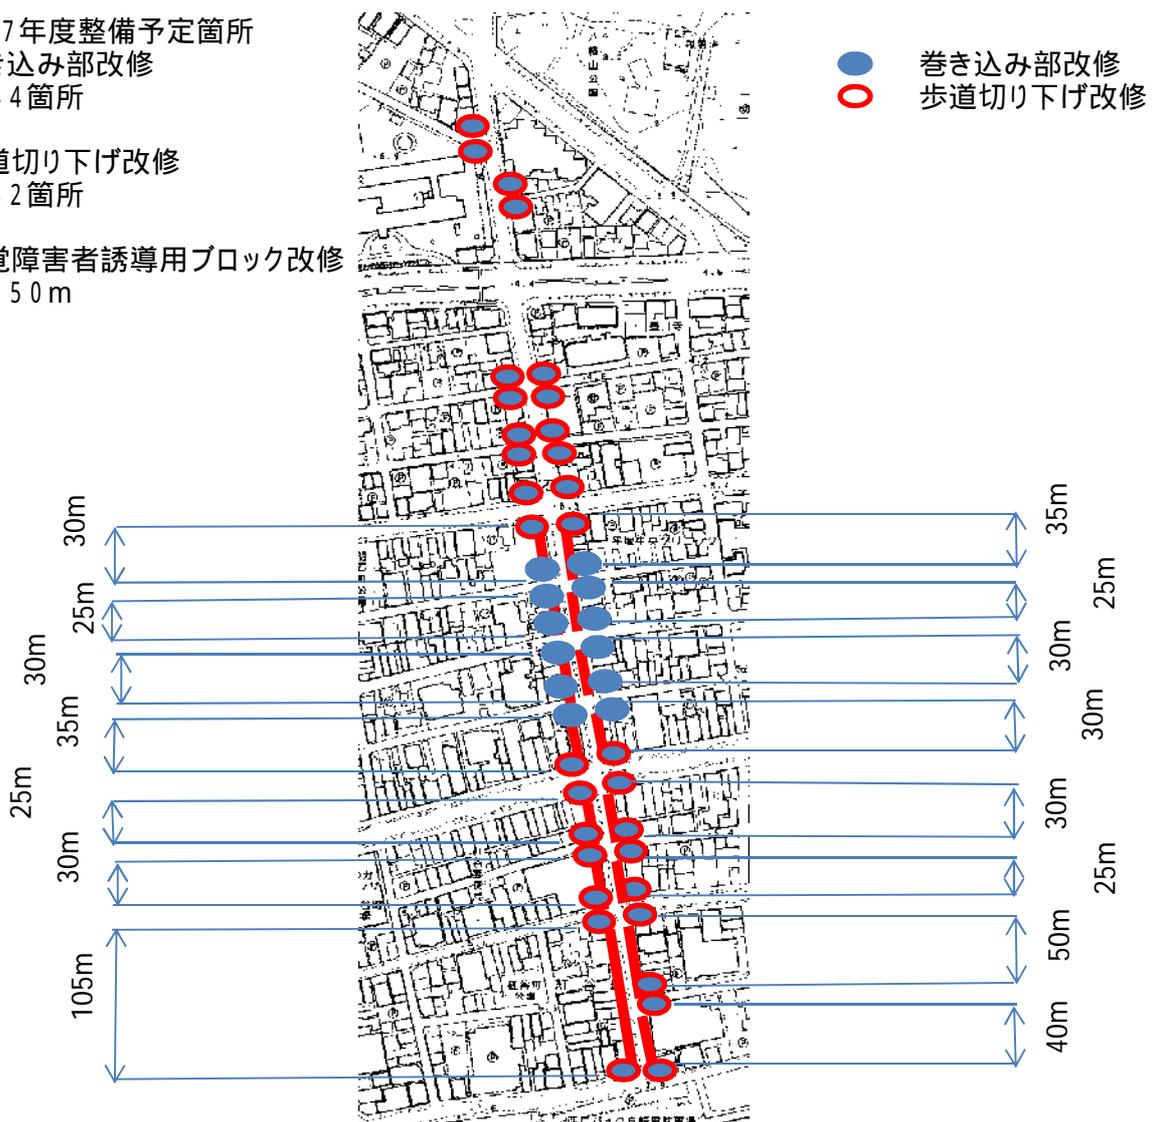


路線名	宝町通り線(幹道30号)	事業者	平塚市
事業区間	平塚駅北口駅前広場 ~ 須馬踏切	区間延長	496m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 視覚障害者誘導用ブロックを未設置部分に設置します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修(セパイクムつきでない)	29箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
視覚障害者誘導用ブロック改修(輝度不足、配置不良、点字無)	900m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
		900							
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

事業詳細

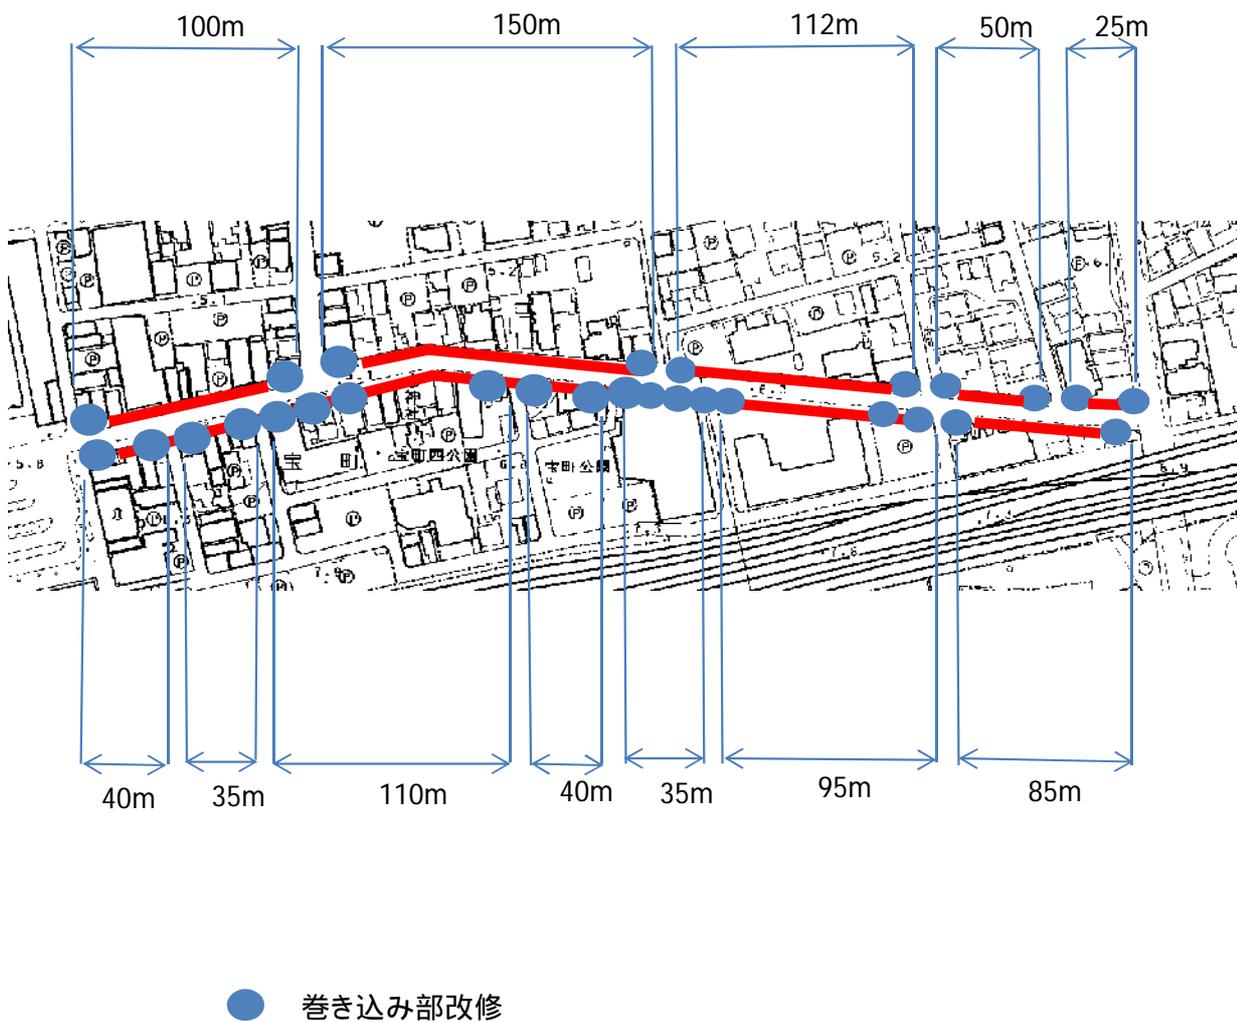

路線名	後谷八幡裏線（幹道28号）	事業者	平塚市
事業区間	郵便局前交差点 ~ 平塚市役所前交差点	区間延長	347m
事業内容	交差点巻き込み部の段差を改善します。 切り下げ部等のすりつけ勾配を改善します。		

事業計画	事業量	事業期間【短期、中期、長期、継続】							
		実績							
巻き込み部改修（セ・テ・ロムつきでない）	1箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
歩道切り下げ改修（8%超え）	2箇所	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
視覚障害者誘導用ブロック改修（破損）	180m	【短期】							
		26	27	28	29	30	31	32	
歩道舗装打ち換え（滑面平板、COとAs混在）	380m	【長期】							
		26	27	28	29	30	31	32	

事業実施に際し配慮すべき事項

歩道のセミフラット化については、切り下げ部、巻き込み部の改修で対応します。

事業詳細

